

2012. 2 . . .
제162회 임시회

- 2011년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과

기획행정국

- 2011년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

기획행정국

연번	건 명	추진부서	현 재 진행상황	완료시기	비고
계	17건 (완료 8, 추진중 -, 향후추진8, 불가 1)				
1	대소원면 청사 신축공사	회 계 과	완 료	2011. 12.	
2	세성3리 마을안길 정비공사	살 미 면	불 가		토지소유자 사용권자
3	살미 설운 배수로 정비공사	살 미 면	향후추진	2012 3~4	
4	수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사	수 안 보	향후추진	2012상반기	
5	수안보면 발화마을 소교량 가설공사	수 안 보	향후추진	2012상반기	
6	상대촌마을 농로포장(1, 2차)	양 성 면	완 료	2011. 11.	
7	탄동 농로포장공사	동 량 면	향후추진	2012. 3.	
8	산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사	산 척 면	향후추진	2012. 5.	
9	향림마을하수도 정비공사	엄 정 면	향후추진	2012. 5.	
10	주동 마을안길 포장 및 배수로 정비공사	엄 정 면	완 료	2011. 12.	

연번	건 명	추진부서	현 재 진행상황	완료시기	비고
11	탄방소하천 정비공사(2공구)	엄 정 면	완 료	2011. 12.	
12	교현어린이공원 놀이시설 탄성포장 공사	교현 2동	완 료	2012. 2.	
13	용산동 충주천 보행도로 정비사업	용 산 동	향후추진	2012 3~4	
14	지현1통 도로변 가로수 식재공사	지 현 동	완 료	2011. 12.	
15	고든골수해대비 배수로 정비공사	호암직동	향후추진	2012. 3.	
16	송림못자리뱅크뒤 농로 및 개거설치공사	달 천 동	완 료	2011. 11.	
17	소가주 농로포장 및 개거설치공사	달 천 동	완 료		권고사항
	이하여백				

-2011년도 행정사무조사--2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 회계과

담당자 : 김영화(☎850-5642)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 대소원면 청사 신축공사

- 현재 임시로 사용하고 있는 면청사가 협소하여 주민들이 불편을 겪고 있으니, 기한내 준공하여 민원인의 불편을 최소화하기 바람.

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 위 치 : 대소원면 대소리 241번지 일원
- 부지면적 : 8,159m²
- 사업규모 : 지상2층, 연면적 1,491m², 철근콘크리트구조
- 사 업 비 : 2,997,750천원

○ 추진일정

- 계 약 : 2011. 5. 11
- 착 공 : 2011. 5. 17
- 준공예정일 : 2011. 12. 22
- 준 공 : 2011. 12. 22

○ 처리결과 : 완료

- 2011. 12월 청사 준공 완료하여 민원인의 불편 최소화

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 살미면사무소

담당자 : 김용수(☎850-8226)>

시정 및 개선 요구사항

□ 세성3리 마을안길 정비공사

- 세성3리 마을회관 앞 부분의 선형이 S자형으로 사고의 위험이 있으며, 노폭이 좁아 차량교행에 어려움이 있으니, 도로확장을 검토하기 바람.

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요



- 공 사 명 : 세성3리 마을안길 정비공사
- 위 치 : 충주시 살미면 세성리 세성3리 마을일원
- 사 업 량 : 아스콘 덧씌우기(T=5cm) A=37a
- 사 업 비 : 50,000천원
- 공사기간 : 2011. 3. 10. ~ 2011. 04. 27.

○ 추진계획

- 도로확장을 추진하려 하였으나, 토지소유자의 승낙거부로 추진 불가(1필지, 약 50㎡)

○ 처리결과 : 추진불가

□ 현황사진

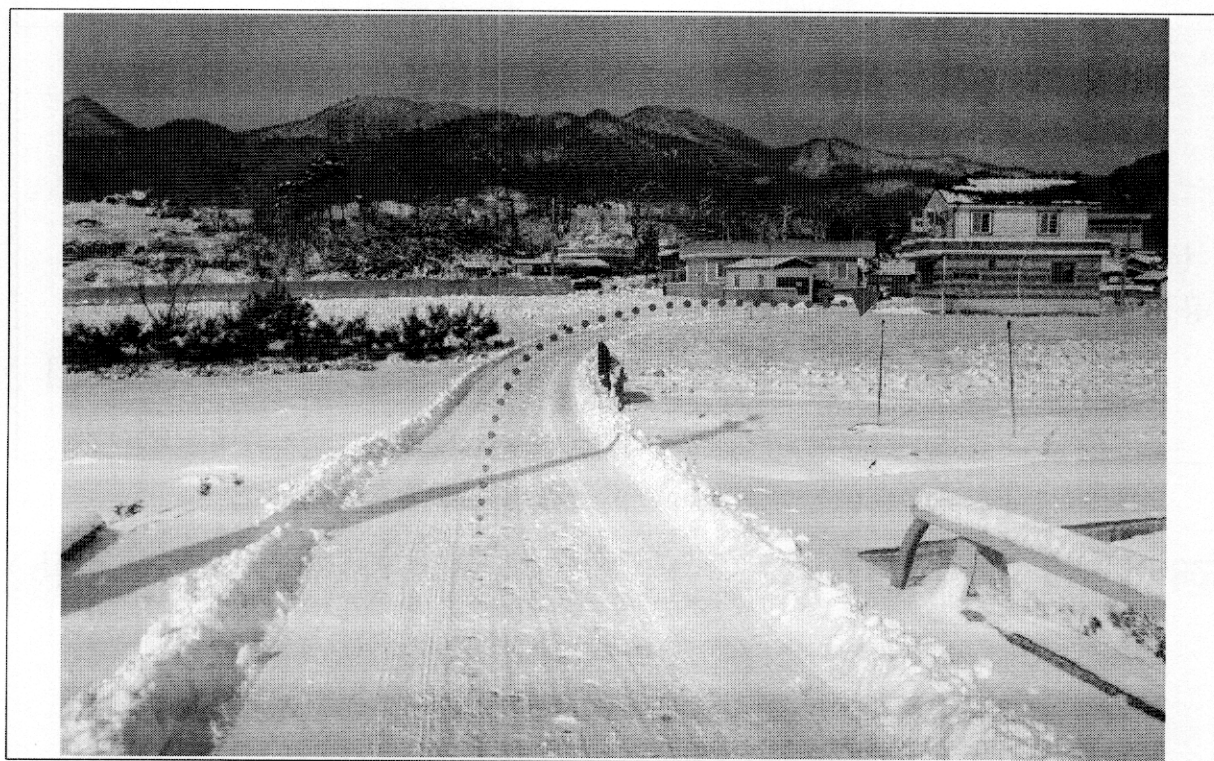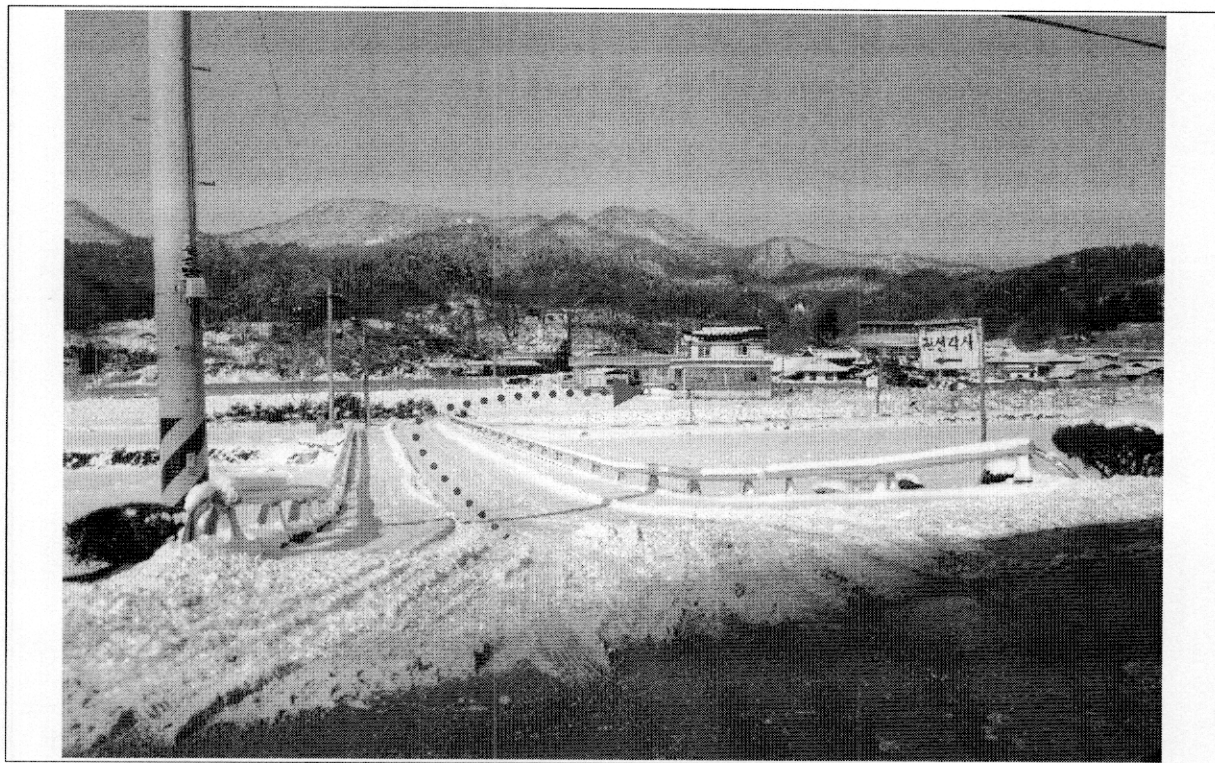

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 살미면사무소

담당자 : 김용수(☎850-8226)>

시정 및 개선 요구사항

□ 살미 설운 배수로 정비공사

- 공사시점으로부터 90m 부근은 인근 야산에서 시작된 물길이 과수원을 거쳐 지나는 곳으로 호우시 과수원의 토사가 배수로로 유입될 우려가 있음. 농로를 컷팅 후 배수관을 매립하는 등의 방법으로 토사유입을 방지하기 바람

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 살미 설운 배수로 정비공사
- 위 치 : 충주시 살미면 설운1리 일원
- 사 업 량 : U형 개거 116m, 콘크리트 포장 166m
- 사 업 비 : 50,000천원
- 공사기간 : 2011. 3. 29 ~ 2011. 5. 27

○ 추진계획

- 당시 농로포장 구간에 영농을 위한 농기계 통행 등으로 공사시기가 맞지 않아, 금년 해빙기후 조치
- ➡ 2012. 3~4월말 : 배수로 설치 완료

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 곽병문(☎850-8236)>

시정 및 개선 요구사항

□ 수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사

- 수안보 지역은 우리 충주시의 대표적 관광지중에 하나임.
따라서 시설물 설치 시 관광객을 위한 미관적 요소도 함께
고려해야 할 것임.
설치된 쉼스에 넝쿨장미 등을 식재하여 미관을 개선하기 바람.

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 사 업 명 : 수안보 농어촌도로 안전시설물 정비공사
- 위 치 : 충주시 수안보면 온천리 957번지 일원
- 사 업 량 : 옹벽 H=2M L=92M, 낙석방지책 H=3M L=72M
- 사 업 비 : 58,813천원

○ 추진계획

- 2012년도 관내환경정비(도로변 꽃묘 식재 등) 사업으로
상반기 추진 예정

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 수안보면

담당자 : 곽병문(☎850-8236)>

시정 및 개선 요구사항

☐ 수안보면 발화마을 소교량 가설공사

- 도로와 다리가 맞닿는 부분에 줄눈을 시공하여 균열을 방지하기 바람.
- 교량 및 옹벽 부분에 안전 휀스를 설치하여 보행자의 안전을 확보할 것
- 교량 끝부분의 각을 정리하여 차량 안전사고를 미연에 방지할 것

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 사업명 : 수안보 발화마을 소교량 가설공사
- 위치 : 충주시 수안보면 화천리 588번지 일원
- 사업량 : BOX(5*2) L=10M, 옹벽 H=3M L=20M
- 사업비 : 48,855천원

○ 추진계획

- BOX교량 및 옹벽 부분에 안전 휀스 설치
➡ 2012년도 주민숙원사업으로 상반기 추진(15백만원)
- 교량 줄눈 시공 및 사면 정리
➡ 2012년도 3월(해빙기) 추진 예정

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사-
시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 양성면사무소

담당자 : 차재곤(☎850-8275)〉

시정 및 개선 요구사항

☐ **상대촌마을 농로포장(1, 2차)**

- 콘크리트 도로를 커팅한 자리에 줄눈을 설치하기 바람.

현황 · 추진계획 · 처리결과




○ **현 황**

- 상대촌마을 농로포장(콘크리트도로)시 줄눈 미설치

○ **처리결과 : 완료**

- 2011. 11월 콘크리트 도로를 커팅한 자리에
 줄눈 시공 완료

□ 줄눈시공

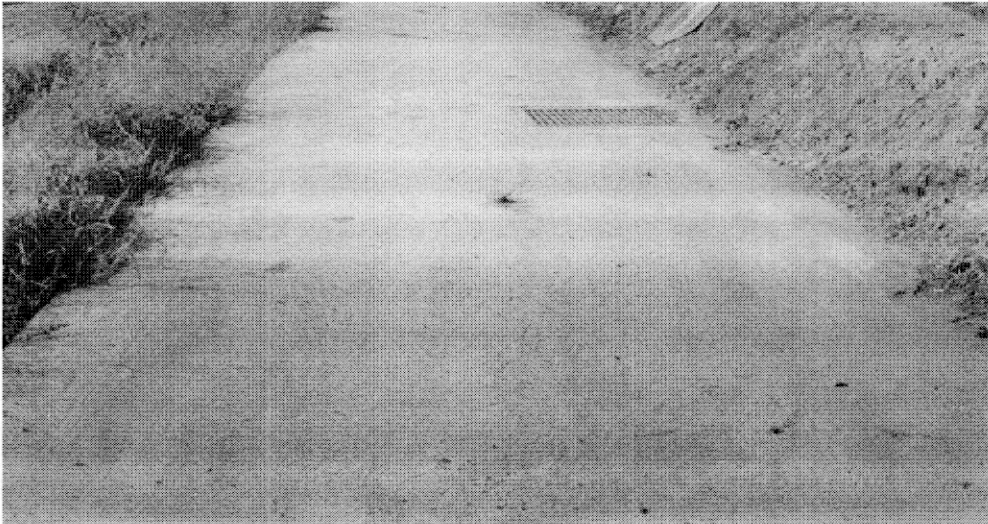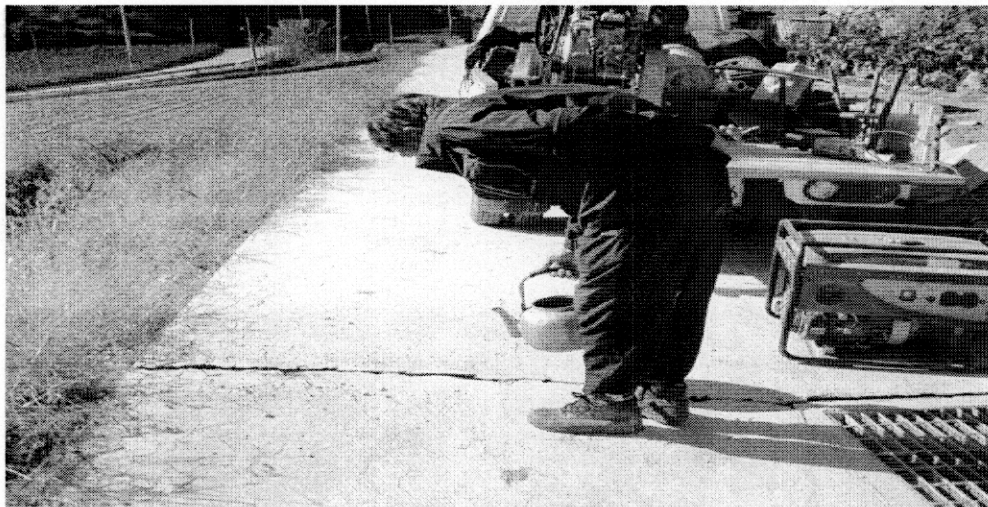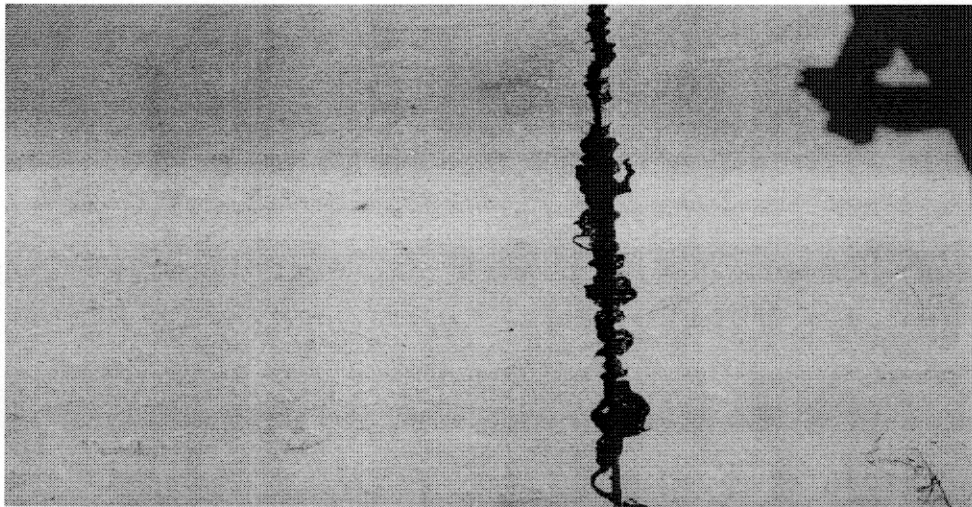공사 전	
공사 중	
공사 후	

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 동량면

담당자 : 이희성(☎850-8306)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 탄동 농로포장공사

- 탄동 농로포장현장 가장자리 난간 설치 및 종점부 도로 밑 옹벽 보강

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황

- 탄동 농로포장공사현장 개울가 가장자리에 경운기 등 운행시 사고의 위험이 있어 난간을 설치하고, 종점부 사면이 무너지지 않도록 보강옹벽 설치 필요

○ 추진계획

- 추진시기 : 2012. 3월경 (해빙이후 추진)
- 개선사항 : 개울가 가장자리 난간 6m 설치,
종점부 사면 보강옹벽 6m 설치

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 산척면사무소

담당자 : 류광열(☎850-8316)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사

- 공사 시작점 법면 마무리에 철저를 기하기 바람.
- 농로 배수로 밑 배관이 흙으로 메워지지 않게 U자형 개거 설치로 보장하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 공 사 명 : 산척면 둔대 세천정비 및 농로포장공사
- 위 치 : 충주시 산척면 영덕리 둔대마을 일원
- 사 업 량 : 전석쌓기(H=1.0~2.0m) L=114m
- 사 업 비 : 31,358천원
- 사업기간 : 2011. 3. 22 ~ 11. 16

○ 추진계획

- 법면 마무리는 공사 시작점에서 상류방향으로 추가 공사를 실시해야 하는 사항으로 추경에 2천만원 확보 추진
- 농로 옆 배수로에는 토지주가 구조물 설치를 거부하여 U자형 개거 설치 어려움

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 엄정면

담당자 : 권세원(☎850-8326)>

시정 및 개선 요구사항

□ 향림마을하수도 정비공사

- 어린이나 노인이 개거에 빠질 위험이 있으므로, 기존 있던 스틸그레이팅을 설치하기 바람
- 기존 수로에 있는 주름관을 없애고 개거를 30m정도 예산 확보하여 추가시공하기 바람.

처 리 결 과

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 엄정면 용산리 향림마을 일원
- 사업기간 : 2011. 9. 14. ~ 2011. 10. 27.
- 사 업 량 : 개거설치 L=68m
- 사 업 비 : 30백만원

○ 추진계획

- 2011. 11월 위험예방을 위하여 기존 스틸그레이팅 임시 설치
- 추경에 사업비 확보하여 개거 연장 및 스틸그레이팅 설치
(개거 L= 30m 연장 / 8백만원)

○ 처리결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 엄정면

담당자 : 권세원(☎850-8326)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 주동 마을안길 포장 및 배수로 정비공사

- 안길 가장자리 턱이 없어 수로에 떨어질 위험이 있으므로 20cm 높이의 위험방지턱을 설치하고 잔여구간 1m정도 연결공사하기 바람.


처 리 결 과

○ 사업개요


- 위 치 : 충주시 엄정면 가춘리 주동마을 일원
- 사업기간 : 2011. 3. 22 ~ 2011. 5. 16.
- 사 업 량 : 암거 L=5m, 콘크리트포장 L=44m, 옹벽 H=1.25m L=20m
- 사 업 비 : 30백만원

○ 처리결과 : 완료

- 2011. 12월 안길 가장자리에 20cm 높이의 방지턱을 설치하고 잔여구간 1m를 자연석 쌓기로 마무리하여 위험예방 조치

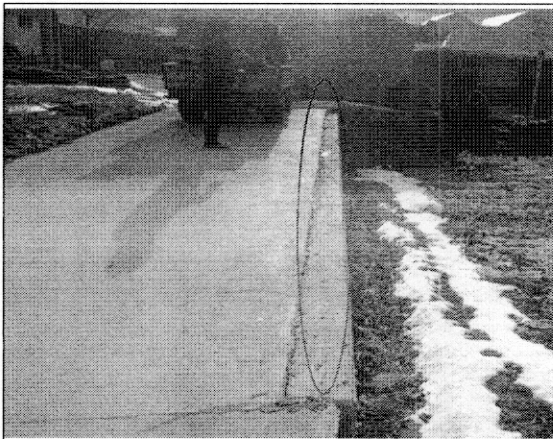

조치 전

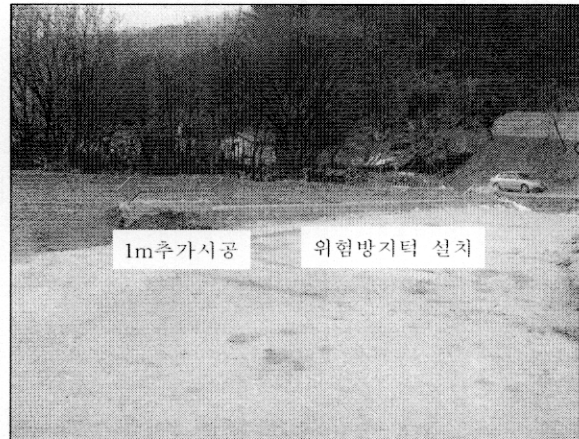

조치 후

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 임정면

담당자 : 권세원(☎850-8326)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 탄방소하천 정비공사(2공구)

- 호우 시 물의 흐름을 막는 소하천 폐 나무를 제거하기 바람.

처 리 결 과

○ 현 황


- 충주시 임정면 신만리 탄방소하천 일원으로 폐목이 하천으로 넘어져 유수 흐름을 방해할 우려가 있음

○ 처리결과 : 완료

- 2011. 12월 소하천 내 유수흐름을 저해하는 폐 나무 등을 제거하여 재해예방 조치



조치 전

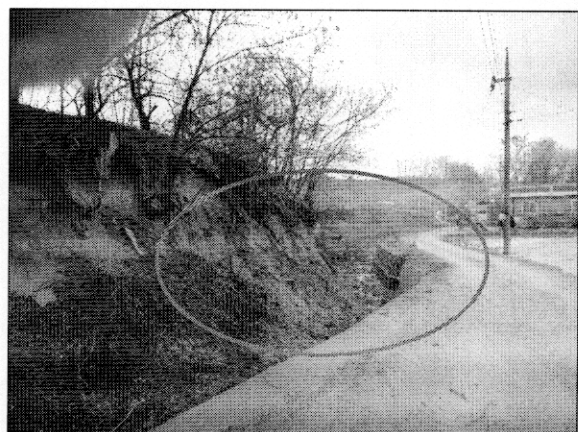

조치 후

- 2011년도 행정사무조사 -
시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 교현2동

담당자 : 조현숙(☎850-2452)〉

시정 및 개선 요구사항

☐ **교현어린이공원 놀이시설 탄성포장 공사**

- 방법용 CCTV를 설치하여 범죄로부터 어린이의 안전을 확보하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 교현동 639번지 일원
- 사 업 량 : CCTV 1개소 / 2대 추가 설치
- 사업기간 : 2011. 11. 9 ~ 2012. 2. 6
- 사 업 비 : 22,000천원
- 촬영범위 : 어린이보호구역 및 도시공원, 놀이터 일원
- 촬영시간 : 24시간 연속 촬영

○ 추진결과 : 완료

□ CCTV 설치 사진



-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 용산동

담당자 : 김선미(☎850-8373)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 용산동 충주천 보행도로 정비사업

- 탄성포장재는 6개월마다 코팅 상태를 확인해서 보수해야하나 업체와의 하자보수기간(2년) 계약서상에 명시가 되지 않았으므로 공문으로 업체와 하자보수 관련 사항을 명기하고 보수하기 바람.
- 보행도로에 비가 많이 올 경우 배수구 구멍이 작아 길가로 넘칠 우려가 있으므로 원형모양으로 배수가 원활한 제품으로 재설치(41곳)하기 바람.

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 사 업 명 : 충주천 보행도로 정비사업
- 위 치 : 충주시 용산동 보행도로(남산교-세신구이)
- 사 업 량 : 656㎡(L=205m, B=3.2m)
- 사 업 비 : 35,000천원

○ 그동안 추진상황

- 2011. 10 「용산동 충주천 보행도로 정비사업」 유지보수 요청(공문)
- 2011. 11 「충주천 보행도로 배수구뚜껑 교체공사」 공사 완료
- 2011. 12 「충주천 보행도로 탄성포장 코팅공사 실시 계획」 회신
※ 회신 공문 별첨

○ 추진계획 : 2012. 3~4월 해빙기에 코팅공사 실시(영상4도 이상)


○ 추진결과 : 향후 추진

□ 배수구 뚜껑 교체공사

조
치
전



조
치
후

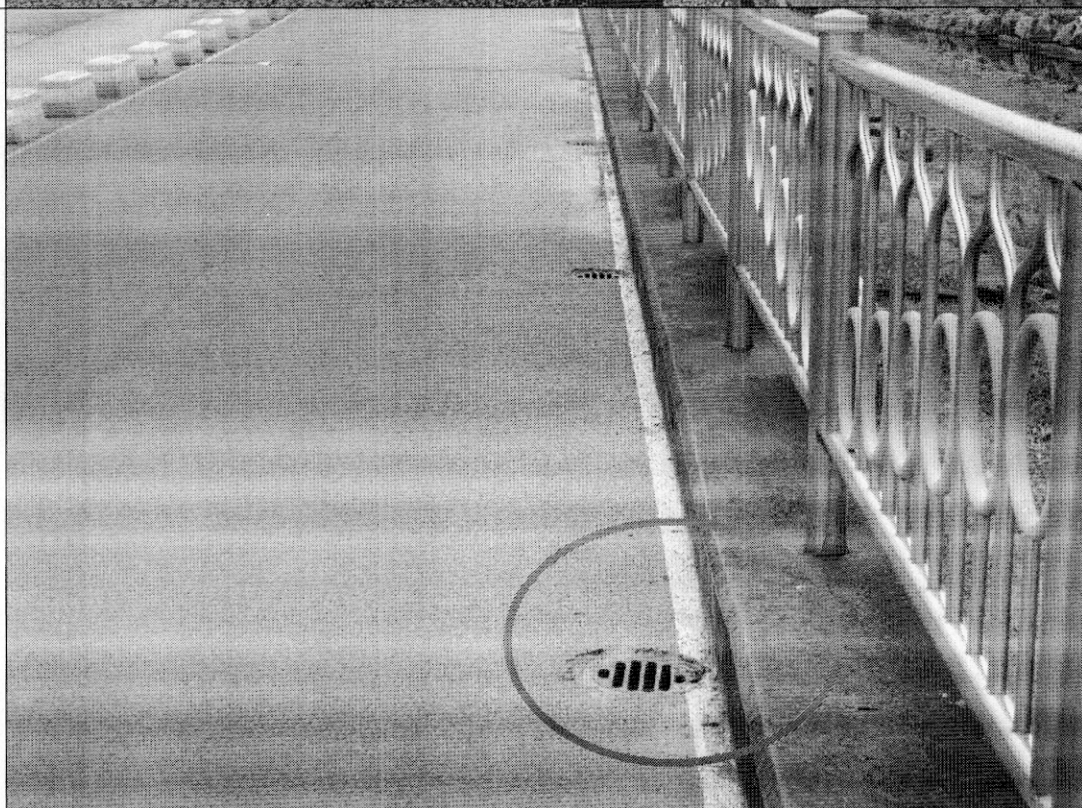

□ 탄성포장 코팅공사 관련 공문

Prunddl 주식회사 푸른돌

제 2011-11호(2011.12.19)

수신자 : 용산동장님

결 유 : 김선미님

제 목 : 충주천 보행도로 탄성포장 코팅공사 실시 계획 건

1. 귀 동사무소의 발전을 기원합니다.
2. 용산동-10330호와 관련입니다.
3. 충주천 보행도로 탄성포장 코팅공사를 아래와 같이 실시코져 하오니 업무에
공조 바랍니다.

- 아 래 -

코팅 시공 예정일	비 고
2012년03월~4월30일 이전	온도가 영상4도 이상시 가능함

주식회사 푸른돌



우 : 135-858 서울시 강남구 도곡1동 548-21 2층 /<http://www.prunddl.com>

전화 : 02-2671-9878 전송 : 02-2671-8055

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 지현동

담당자 : 임주연(☎850-2477)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 지현1통 도로변 가로수 식재공사

- 복토해서 옹벽단면을 맞춰 화단을 재정비하기 바람
- 사업개요 현황판(나무명, 식재수 등)을 설치하여 주민들의 편의를 도모하기 바람.
- 사유지와 시유지(공사구역) 경계말뚝을 세워 구분을 명확히 하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황

- 화단이 옹벽단면 보다 낮아 미관상 좋지 않음
- 주민들이 쉽게 알 수 있도록 안내판 필요(나무명, 나무수종)
- 사유지와 사유지 경계가 모호함

○ 처리결과 : 완료(2011. 12월)

- 복토해서 옹벽단면을 맞춰 화단 재정비
- 사업개요 현황판 1개, 나무수종 안내판 14개 설치
- 공사구역에 경계말뚝 설치

□ 화단 재정비

조
치
전



조
치
후




□ 현황판 설치

조
치
전



조
치
후

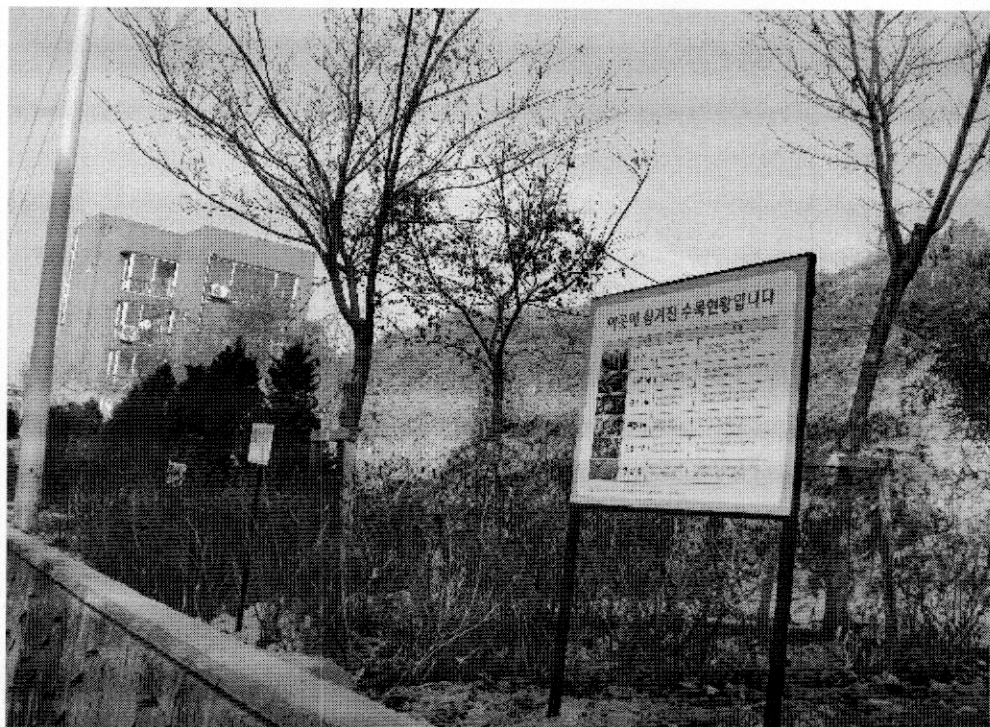

□ 공사구역 경계말뚝 설치

조
치
전



조
치
후



-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 호암직동

담당자 : 이재우(☎850-2495)〉

시정 및 개선 요구사항

직동 고든골수해대비 배수로 정비공사

- 전석 기초 세굴이 수해시 무너지지 않도록 기초 보강에 철저를 기하기 바랍.

현황 · 추진계획 · 처리결과

○ 사업개요

- 위 치 : 충주시 직동 321-1번지 고든골마을 일원
- 사 업 량 : 전석쌓기 H=1.2~2.4m L=130m
- 사 업 비 : 29,900천원
- 공사기간 : 2011. 3. 23 ~ 2011. 5. 21 (공정100%)

○ 추진계획

- 2011. 10~11월 하천 주위 과수경작으로 장비 진입 불가
- ➡ 2012. 3월 해빙 후 하상바닥 정리 및 전석기초 보강 조치

○ 추진결과 : 향후 추진

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 달천동

담당자 : 이종민(☎850-2706)>

시정 및 개선 요구사항

○ 송림못자리뱅크뒤 농로 및 개거설치공사

- 농로 턱에 철심이 통행불편을 초래함으로 제거하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황

- 송림못자리뱅크 뒤 농로포장 및 개거설치 공사시
농로 가장자리턱을 설치하면서 일부 거푸집 타이 미제거

○ 처리결과 : 완료

- 2011. 11월 농로 턱에 철심(거푸집 타이) 제거



- 전(前) -



- 후(後) -

-2011년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 달천동

담당자 : 이종민(☎850-2706)〉

시정 및 개선 요구사항

○ 소가주 농로포장 및 개거설치공사

- 공사주변 인접주택 우수 배수로를 향후 기본설계에 반영하여 주민편의를 도모하기 바람
- 공사주변 밭에 흙이 개거에 유입되지 않도록 향후 기본설계시 J형 개거 설치 등 현장에 맞는 설계를 실시하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 추진계획

- 앞으로 모든 시설공사 현장을 면밀히 검토하여 주민불편이 발생하지 않도록 사업추진에 만전을 기하겠음

○ 처리결과 : 완료
