

2013. 2 . .
제174회 임시회

- 2012년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과

경 제 건 설 국



- 2012년도 행정사무조사 - 시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

경제건설국

연번	건 명	추진부서	현재 진행상황	완료시기	비고
계	17 건				
1	충의시장 주차장 조성공사	경제과	완료	12.10.26	
2	충주기업도시 진입도로 개설공사	기업 지원과	향후추진	2020년	
3	주덕읍 신중리 842 불법건축물 (오리축사)	지역개발과 (건축디자인과, 환경정책과)	추진중	2013.06	
4	양성 후곡~강천간 도로 확포장 공사	도로과	추진중	2016.10	
5	북충주~가금간 도로확포장공사	도로과	추진중	2014.05	
6	가금~칠금간 도로확포장공사	도로과	추진중	2014.03	
7	충주의료원진입도로 확포장공사	도로과	추진중	2016년	
8	건국대사거리~마이웨딩홀간 도로중앙분리대조경공사	도로과	완료	12.12.31	
9	건국대사거리 달천교간 노후가로등 교체공사	도로과	완료	13.01.11	

※ 현재진행상황 : 완료, 추진중, 향후추진, 불가

- 2012년도 행정사무조사 - 시정 및 개선요구사항 처리결과 보고서

경제건설국

연번	건명	추진부서	현재 진행상황	완료시기	비고
10	엄정강현~논동간 도로개설공사	도로과	추진중	2013.10	
11	금가도촌 도시계획도로개설공사	도로과	추진중	2013.10	
12	주덕공설묘지 진입로 확포장공사	도로과	추진중	2014.10	
13	지현동도심공원 공영주차장 확장	교통과	완료	12.12.28	
14	수안보 공영주차장 조성공사	교통과	완료	12.12.28	
15	강변길 조성사업	건축 디자인과	완료	13.01.03	
16	요도천 환경조성사업	재난 관리과	완료	12.12.20	
17	대소원면 분리소하천 정비공사	재난 관리과	완료	12.12.19	

※ 현재진행상황 : 완료, 추진중, 향후추진, 불가

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 경제과 생활경제담당 담당자 : 권봉주(☎6021)>

시정 및 개선 요구사항

□ 충의시장 주차장 조성공사

- 주차장 북쪽에 식재된 왕벚나무는 상가와 주차장이 격리된 느낌을 주며, 서쪽에 식재된 소나무는 수형이 상당히 떨어지는 실정임.
상가 및 인근 주민들의 의견을 수렴하여 주변 경관과 어울릴 수 있는 반송 등의 수종으로 대체 식재하기 바람.
- 화단에 잔디를 보식하여 토사 유출을 방지하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 충인동 충의시장 일원
- 공사기간 : 2012. 5. 15 ~ 2012. 11. 9
- 사 업 량 : 아스콘포장 A=1,391㎡, 조경수목 식재 984주
주차관제설치 1식, 주차대수 45대, 현수막걸이 설치 1식
- 사 업 비 : 183,000천원(도급 89,257천원, 관급 93,743천원)

○처리결과(실적)

- '12. 10. 26 : 개선요구사항 처리완료
 - 왕벚나무 4그루 → 반송(둥근소나무) 4그루 교체
 - 소나무 5그루 중 고사목 3그루 교체 및 전정작업 실시
 - 전체 화단 잔디식재

사 진 대 지

□ 내 용 : 충의시장 주차장 조성공사(왕벚나무⇒반송 대체)



사진설명 대체 전



사진설명 대체 후(반송 식재)

□ 내 용 : 충의시장 주차장 조성공사(소나무 고사목 교체)



사진설명 교체 전



사진설명 교체 후, 전정작업 실시

□ 내 용 : 충의시장 주차장 조성공사(잔디 식재)



사진설명 화단 잔디 식재중



사진설명 화단 잔디 식재후

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 기업지원과 기업도시담당 담당자 : 이광재(☎6081)>

시정 및 개선 요구사항

□ 충주기업도시 진입도로 개설공사

- 현 설계에는 사람과 자전거가 병행사용할 수 있도록 되어 있으나 안전 사고가 우려되는 만큼 보도에도 자전거가 통행할 수 있도록 검토하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 가금면 하구암리 일원
- 공사기간 : 2010. 8. 24 ~ 2012. 12. 31
- 사업량 : L=1.72km, B=30m(편도 3차선)
※ 보도 및 자전거 겸용도로 : 폭 2.75m
- 사업비 : 286억원
- 공정율 : 100%

○추진계획

- 2012년(기반조성완료) : 보도 및 자전거 겸용도로 설치 완료
- 2020년(도시조성완료) : 자전거 전용도로 설치 검토

○처리결과(실적)

- 2012년 정부종합감사 시 외곽도로로 이용도가 적고 예산이 과다하게 소요되어 인도설치를 제외하도록 지적되었으나 보도 및 자전거 겸용도로로 이용하는 것으로 이해·설득하여 겸용도로로 설치
- 기업도시 활성화로 도시조성이 완료되는 2020년까지 이용도를 검토하여 필요시 자전거 전용도로 설치 검토

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 지역개발과 도시관리담당 담당자 : 배제경(☎6123)
건축디자인과 주거환경담당 담당자 : 지상진(☎6432)
환경정책과 수질관리담당 담당자 : 신희만(☎3653)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 주덕읍 신중리 842 불법건축물(오리축사)

- 해당 위치에 오리축사 설치 및 사육을 위해서는 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 제56조 제1항(개발행위의 허가), ‘건축법’ 제11조(건축허가), ‘충주시 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 조례’(제3조) 의거 허가를 득하여야 하나, 아무런 허가 없이 불법으로 건축물을 설치하고 오리를 사육하고 있음.
- 또한, 가축사육 전부제한지역인 상가지역에서의 오리사육으로 인해 인근 주민들이 악취로 고통을 받고 있는 실정임.
- 관련법에 따라 불법 부분을 엄정하게 처리하여 법질서 확립에 만전을 기하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 주덕읍 신중리 842번지
- 행 위 자 : 김 준 회(60년생)
- 토지면적 : 11,124.7㎡(지목 : 답)
- 대 상 : 축사(철파이프조 7,920㎡), 관리사(컨테이너 18㎡)
- 위법내용 : 국토의 계획및이용에관한 법률 제56조(개발행위 허가) 건축법 제11조(건축허가)위반

○처리결과(실적)

<지역개발과>

- 2012. 9. 7 : 토지무단형질변경(축사·오리농장)에 대한 원상복구 지시
- 2012.11. 6 : 진술서 징구(농장 가능지 구입하는데로 이전 약속)

<건축디자인과>

- 2011. 03. 17 : 시정명령 1차
- 2011. 04. 25 : 시정명령 2차
- 2011. 05. 20 : 위법건축물 고발
 - 처분결과 : 구약식 벌금 700만원
- 2011. 06. 14 : 시정명령 3차
- 2012. 02. 08 : 위법건축에 따른 이행강제금 부과제고
- 2012. 09. 30 : 이행강제금 부과제고 기간연장
- 2012. 09. 30 : 진술서 징구(농장 가능지 구입하는데로 이전 약속)
- 2012. 10. 22 : 이행강제금 부과제고 기간연장(2013. 3. 30)
 - ※ 연장사유 : 이행강제금 부과시 경제적 부담으로 가정파탄
- 행위자는 인천에서 운수업에 종사하다가 주덕읍으로 귀촌 전 재산을 오리축사에 투자 현재 채무가 7억원이상으로 이행강제금 부과보다는 자진철거 및 이전을 종용

<환경정책과>

- 위반내용 : 가축사육제한지역 내 가축 사육
- 관련근거 : 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 제8조
- 지금까지 조치사항
 - 2012. 4. 13 : 과태료 부과(1차 : 100만원)
 - 2012. 10.22 : 과태료 부과(2차 : 300만원) 및 가축사육금지 조치명령 행정처분(2013. 6. 30)

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 농촌도로담당 담당자 : 박선규(☎6231)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 양성 후곡~강천간 도로 확포장공사

- 도로확장 공사를 위한 법면이 방치되어 있으므로 여름철 우기시나 봄철 해빙기에 토사유출, 산사태 등 안전에 문제가 없도록 보수공사 및 측구공사에 철저를 기하고 법면 정비가 된 곳은 통행할 수 있도록 포장을 하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사 업 명 : 양성 후곡~강천간 도로 확포장공사
- 위 치 : 충주시 양성면 영죽리, 강천리 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=2.11km, B=8.5
- 총사업비 : 5,400백만원(기투자:2,200, 2013년도:1,000, 향후:2,200)
- 사업기간 : 2009. 03. ~ 2016. 10.

○추진계획

- 2013. 02 : 사업발주(토공)
- 2013. 10 : 사업 준공
- 2016. 10 : 연차사업 마무리

※ 2013 당해예산으로 시비 1,000백만원 확보

○처리결과(실적)

- 2013년 확보한 예산으로 여름철 우기시나 봄철 해빙기에 토사 유출 및 산사태 등 안전에 문제가 없도록 철저히 조치하겠음.

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 농촌도로담당 담당자 : 박선규(☎6231)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 북충주~가금간 도로확포장 공사

- 도비가 지원되지 않아 보상이 지연되고 있는바 2013 세계조정선수권대회 이전에 도로가 임시개통이 될 수 있도록 내년도 본예산에 도비가 확보되도록 만전을 기하기 바람.
- 기업도시진입도로 왕벚나무 가로수와 연계하여 어우러질 수 있도록 도로변에 왕벚나무를 식재하는 방안을 검토하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사 업 명 : 북충주IC ~ 가금 국지도건설공사
- 위 치 : 충주시 노은면 수룡리, 가금면 하구암리 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=4.986km
- 총사업비 : 43,993백만원
- 사업기간 : 2009년 ~ 2014년

○추진계획

- 2013. 03 : 교량 및 배수구조물 완료예정
- 2013. 07 : 전구간 도로포장(중간층) 완료예정
- 2013. 08 : 세계조정선수권대회 이전 임시개통

○처리결과(실적)

- 2013년 공사비 및 부족분 보상비를 전액 확보하였으며 2013. 08 세계조정선수권대회 이전 임시개통을 목표로 전력을 다하겠음.

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 농촌도로담당 담당자 : 박선규(☎6231)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 가금~칠금간 도로확포장 공사

- 평면교차로로 되어 있어 신호등이 너무 많으므로 차량 흐름에 지장이 없도록 신호등 연동제가 되도록 강구하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사 업 명 : 가금~칠금간 국지도확포장공사
- 위 치 : 충주시 가금면 하구암리 ~ 칠금동 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=6.607km
- 총사업비 : 117,400백만원
- 사업기간 : 2005년 ~ 2014년

○추진계획

- 2013. 05 : 전구간 도로포장(중간층) 완료예정
- 2013. 07 : 세계조정선수권대회 이전 조기개통

○처리결과(실적)

- 도로 임시개통전 관련부서(기관)와 협의하여 교통신호등 연동체계 구축

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 도로과 도시도로담당 담당자 : 김용민(☎6221)>

시정 및 개선 요구사항

☐ 충주의료원진입도로 확포장공사

- 골프랜드 앞 도로에서 마즈막재구간까지 확포장이 되지 않은 구간은 차량통행에 불편함이 없도록 확포장 하기 바람

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 안림동 남산골프랜드 ~ 마즈막재
- 사업규모 : L=0.8km, B=25m
- 사업기간 : 최소 4년이상 소요(설계, 보상, 공사)
- 사 업 비 : 약 60억(보상비 30억, 공사비 30억)

○추진계획

- 충주호 및 화장장의 주진입도이며 지방도(531호) 연결도로로 사업 필요성이 제기되나 막대한 사업비가 소요되므로 교통량 및 주변 개발계획과 예산확보방안 등을 면밀히 검토하여 사업추진 필요

○처리결과(실적)

- 본 사업구간의 교통흐름에 불편이 발생치 않도록 지속적인 관리 및 국·도비 등 예산확보에 최선의 노력

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도로보수담당 담당자 : 이상운(☎6241)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 건국대사거리~마이웨딩홀간 도로중앙분리대조경공사

- 겨울철 강설시 염화칼슘 살포로 나무가 고사될 수 있으므로 사후관리에 철저를 기하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 공 사 명 : 건국대사거리 ~ 마이웨딩홀간 도로중앙분리대 설치공사
- 위 치 : 충주시 달천동, 문화동 일원
- 사 업 량 : 중앙분리대설치 L=480m, B=1.0m
- 총사업비 : 290백만원(설계비 13, 중앙분리대 137, 조경공사비 140)
- 사업기간 : 2011. 4. 15. ~ 2012. 12. 31.

○추진계획

- 제설작업 전에 염화칼슘 등에 대비할 수 있도록 월동거적 설치

○처리결과(실적) : 월동거적 설치완료

- 공 사 명 : 달천동 중원대로 중앙분리대 월동거적설치공사
- 사 업 량 : 월동거적설치(W1.0m×H0.45m× L=954m)
- 총사업비 : 9,180천원
- 완 료 일 : 2012. 12. 31

- 2013년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과 사진



달천동 중원대로 중앙분리대 월동거적설치공사 (2013. 12. 31. 완료)

4/

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도로조명담당 담당자 : 차원복(☎6251)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 건국대사거리 달천교간 노후가로등 교체공사

- 가로등에 거미줄 및 날파리 등이 많이 부착되어 있어 가로등이 제기능을 다하지 못하고 지저분하므로 유지관리에 철저를 기하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 건국대사거리~달천교간 노후가로등 교체공사 이후 가로등에 거미줄 및 날파리 등이 많이 부착되어 있어 가로등이 제기능을 다하지 못하고 지저분함


○추진계획

- 가로등 램프 고장으로 인한 보수시 등기구 및 글로브 청소를 병행하여 유지관리 효율 개선

○처리결과(실적)

- 가로등 램프 고장으로 인한 보수시 등기구 및 글로브 주변 거미줄 및 날파리 청소 병행하여 추진중
- 건국대사거리~달천교간 가로등 청소 실시 (2013. 1. 11. 완료)

- 2012년도 행정사무조사 -
시정 및 개선요구사항 처리결과 사진

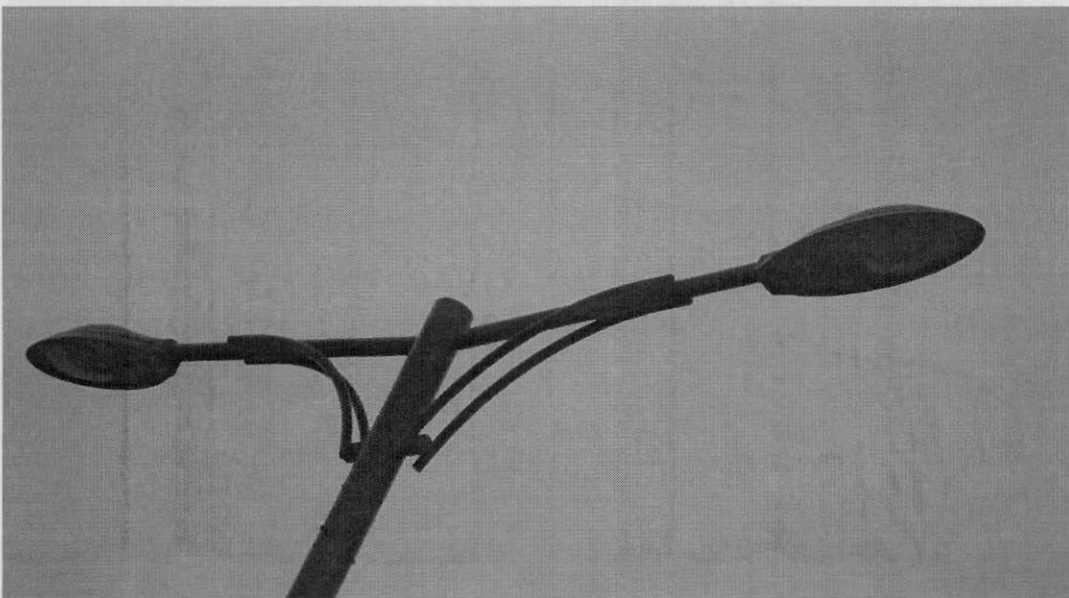

건국대사거리~달천교간 가로등 등기구 청소 실시 (2013. 1. 16. 완료)

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 농촌도로담당 담당자 : 장운석(☎6232)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 엄정강현~논동간 도로개설공사

- 기존도로와 신설된 도로 이음부분을 절삭하여 수평을 맞춰 차량운행에 지장이 없도록 하기 바람.
- 논동교차로에 반사경을 설치하여 차량안전 운행을 도모하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사업명 : 엄정강현~논동간 도로개설공사
- 위치 : 충주시 엄정면 논강리 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=1.31km
- 총사업비 : 1,115백만원(기투자:995, 2013년도:120, 향후: -)
- 사업기간 : 2009. 3 ~ 2013. 10

○추진계획

- 2013. 02 : 사업 발주
- 2013. 10 : 사업 준공

○처리결과(실적)

- 금년도 사업추진시 기존도로와의 이음부분에 요철 등이 발생하지 않도록 시공에 철저를 기하겠음.
- 반사경 설치는 3월중에 설치토록 하겠음

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 도시도로담당 담당자 : 이창근(☎6222)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 금가도촌 도시계획도로 개설공사

- 도시계획상 12m 도시계획도로이나 도로 좌측은 한국농어촌공사의 구거가 주간선으로 협의가 이뤄지지 않아 8m 도로만 개설했으므로 도시계획선을 현행에 맞게 변경하기 바람.
- 향후 미개설 구간을 당초예산 확보후 전체 도로를 개통하여 주민들의 교통 편의를 도모하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사업명 : 금가도촌 도시계획도로개설공사
- 사업량 : 도로개설 L=300m B=8.0m
- 위 치 : 금가면 도촌리 도촌마을 일원
- 사업비 : 300백만원(2013년 당초예산)

○추진계획

- 2013. 3월 : 사업발주(착공일로부터 180일간)
- 2013. 10월 : 사업준공(안) ⇨전체구간 준공(L=1,070m)

○처리결과(실적)

- 미개설구간은 2013년 당초예산 300백만원을 확보하여 금년도에 준공예정이며, 금회공사 준공시 전체구간(L=1,070m)을 완공하여 주민들의 통행불편을 해소하고 지역발전에 기여할 수 있으리라 사료됨.
- 농어촌공사 구거부지로 인해 도로를 부분개설(B=8.0m)한 구간의 도시계획시설(도로) 변경은 담당부서(지역개발과)와 협의결과, 향후 해당지역의 개발현황 및 도시화 진행추이를 장기적으로 검토하여 현행유지(B=12m) 또는 변경(B=8m)을 추진하고자 함.

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 도로과 농촌도로담당 담당자 : 김희준(☎6233)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 주덕공설묘지 진입로 확포장공사

- 원화곡2리 마을회관 앞 도로는 인근에 광산이 ((주)덕산) 위치하여 광산 차량의 통행으로 인한 사고의 위험성이 높으니 노면을 이용하여 인도를 설치하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사업명 : 주덕 공설묘지 진입로 확포장공사
- 위치 : 충주시 주덕읍 화곡리 일원
- 총사업량 : 도로확포장 L=2.4km, B=8.5(6.5)m
(기개설 1.75km, 미개설 0.65km)
- 총사업비 : 3,070백만원(기투자:2,070, 2013년도:600, 향후:400)
- 사업기간 : 2007. 03. ~ 2014. 10.

○추진계획

- 2013. 02 : 사업 발주(기개설도로 인도설치 포함)
- 2013. 10 : 사업 준공
- 2014. 02 : 마무리사업 착공

※ 2013 당해예산으로 시비 600백만원 확보

○처리결과(실적)

- 주민통행 불편 및 안전사고 예방을 위하여 잔여예산(400백만원) 확보 추진

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 교통과 교통지도담당 담당자 : 김은철(☎6323)>

시정 및 개선 요구사항

□ 지현동도심공원 공영주차장 확장

- 호우시 기 조성된 골목길로 우수가 집중 유입되어 인근 주택가에 피해가 우려되므로 커팅 및 그레이팅 작업을 실시하여 집중호우시 배수에 만전을 기하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 지현동 1115외 3필지
- 면 적 : 1115m²
- 주차면수 : 29면

○추진계획

- 집중호우시 우수 집중 방지를 위한 배수로 설치
- 원활한 주차를 위한 차광벽 설치

○처리결과(실적)

- 주차장 시설보완공사를 실시하여 배수로 및 차광벽 설치완료
(12. 28일 준공)

사 진 대 지

☐ 내 용 : 배수로 설치

전



후



사 진 대 지

□ 내 용 : 차광벽 설치

전



후



-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 교통과 교통지도담당 담당자 : 김은철(☎6323)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 수안보 공영주차장 조성공사

- 주차장과 남쪽, 서쪽으로 인접하고 있는 건물이 후면으로 주차장과 접하고 있어 미관상 좋지 않으니 벽화를 그리는 등의 방법으로 미관을 개선하기 바람.
- 차량내 금품 도난, 차량 파손 등의 방지를 위해 CCTV를 설치하기 바람.
- 화장실 앞 경계석 모서리를 둥글게 하여 타이어 파손을 방지하기 바람.
- 화장실 운영계획이 수립되어 있지 않은 바, 관리부실이 우려되니 조속히 운영계획을 마련하여 관리에 철저를 기하기 바람.
- 공영주차장 안내판을 설치하여 관광객의 편의를 도모하고 화단에 잔디를 보식하여 토사 유출을 방지하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 위 치 : 수안보면 온천리 218-2
- 면 적 : 1,455m²
- 주차면수 : 40면

○추진계획

- 벽면 미관 개선을 위한 도색공사 실시
- 공영주차장 안내판을 설치하여 관광객 편의 도모
- 화장실 운영계획을 수립하여 관리 철저

○처리결과(실적)

- 주차장 시설보완공사를 실시하여 도색공사 및 주차안내판 설치 및 경계석 글라인딩 작업완료 (12. 28일 준공)
- 수안보온천관광협의회 자체 화장실 운영계획수립 후 관리 (수안보온천관광협의회회장 최지원 HP 010-3419-9918)
- 수안보온천관광협의회에서 충주경찰서로 방범용CCTV 설치 요청 (방범용CCTV는 2009년 국가사무라는 지적이후 행정안전부 소속 경찰청 생활안전국으로 권한이관)

사 진 대 지

□ 내 용 : 도색공사 및 주차안내판 설치

도
색
전



도
색
후



안
내
판
설
치



5

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

〈업무담당부서 : 건축디자인과 경관담당 담당자 : 이상용(☎6451)〉

시정 및 개선 요구사항

□ 강변길 조성사업

- 전체적으로 안내표지판이 부족하여 외지관광객이 방향 찾기가 어려우니 곳곳에 안내표지판을 설치하기 바람.
- 철새 조망 표지판 근처가 낭떠러지여서 관광객 추락위험이 있으니 안전시설을 설치하기 바람.
- 전망대 앞 수자원공사의 방송시설 이전을 협의하여 주차장 조성을 검토하기 바람.
- 강변길 주변 토지를 수자원공사에서 임대하여 영농행위를 하는 곳이 있는데, 토사유출, 수질보전 등을 위해 더 이상 토지임대가 되지 않도록 수자원공사와 협의하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 사업구간 : 내수면연구소 ~ 충원교(L=1.8km, B=1.2m 이하)
- 사 업 비 : 198백만원(도급 168백만원, 관급 30백만원)
- 사업기간 : 2012. 4. 3. ~ 9. 29.
- 사업내용 : 산책로 조성, 전망대, 가림시설, 목재계단 설치 등
- 시공업체 : 진천조경건설(주) 대표 정창호
- 준 공 일 : 2012. 9. 26.

○처리결과(실적)

- 안내표지판 추가 설치 : 기존(7개소)+추가(3개소) = 10개소
- 목책 휀스 설치 : 철새 조망 표지판, 가림시설 부분
- 하천구역 내 토지 : 20필지(국공유지 14필지, 사유지 : 6필지)
- 하천점용허가 : 1필지(134㎡), 점용기간('11. 11. 11~'15. 12.31)
- 전망대 앞 방송시설 한국수자원공사와 이전 협의 중
- 산책로 잡석 깔기
- 강변길 보강공사 준공일 : 2013. 1. 3.

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 재난관리과 재난복구담당 담당자 : 민경상(86512)>

시정 및 개선 요구사항

□ 요도천 환경조성사업

- 요도천 하천정비공사와 함께 일부 방치된 제방사면에는 잔디 식재로 마무리를 하고 하천변 둔치에는 친환경적인 물갈대 등을 식재하는 방안을 검토하기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○ 현 황(개요)

- 위 치 : 충주시 신니면 문송리 ~ 주덕읍 당우리 일원
- 사 업 량 : 생태하천조성 L=4.6km
 - 주요내용 : 축제 및 호안공, 자전거도로, 산책로, 보 보수 및 어도설치, 여울설치, 목교설치, 친수공간 등
- 공사비 : 5,068백만원
 - 도금액 : 3,556백만원, 관급액 : 1,512백만원
- 공사기간 : 2010. 12. 30 ~ 2012. 12. 20 / 사업완료

○ 처리결과(실적)

- '12. 12. 06 설계변경
- '12. 12. 14 공사장비 진출입로 잔디식재 완료 - 18개소(1,932㎡)
- '12. 12. 19 용원교 주변 둔치 물억새 식재 및 씨앗살포 완료 (2,314㎡)

조치결과 현황사진



공사차량 진출입사면 잔디식재



물억새 식재

-2012년도 행정사무조사- 시정 및 개선 요구사항 처리결과

<업무담당부서 : 재난관리과 하천관리담당 담당자 : 백승대(☎6542)>

시정 및 개선 요구사항

□ 대소원면 본리소하천 정비공사

- 1공구 입구부터 가정마을 쪽 100m정도 구간이 하천제방과 기존 도로와의 노면 높이 차이가 많이 발생하니 노면 높이를 맞추기 바람.
- 가정마을 입구 소교량 날개부분이 노면 보다 높아 사고의 우려가 있으니 날개부분과 노면 높이를 맞추기 바람.

현황·추진계획·처리결과

○현 황(개요)

- 하천제방과 기존 도로와의 고저차 발생으로 우수시 우수량 발생으로 인한 도로이용 저해 및 노면파손 발생우려.
- 기존 교량과 도로면의 고저차로 인한 사고위험 발생.

○처리결과(실적)

- 대소원 본리 소하천정비공사 설계변경 (3차변경)
(2012. 12. 17일)
- 도로면 성토완료, 배수암거 신설(5.0*3.5*7.5m) 및 도로포장
(아스콘 L=100m) 준공완료.
- 기존 교량의 날개벽 일부제거(L=2.0~2.5m H=0.3m) 및 도로포장
(아스콘 L=85m) 준공완료(2012. 12. 19일)

조치결과 현황사진



암거박스 및 날개벽 신설



성토후 포장완료
