

2006. 2. .
제104회 임시회

- 2005년도 행정사무조사 -

지 적 사 항 처 리 결 과

물 관 리 사 업 소

2005년도 행정사무조사 처리결과 목록

소관부서	시정 및 개선요구사항	추진상황
계	7건(완료4 , 향후추진 3)	
물 정 책 과	1. 교현천 오염하천 정화사업	완 료
"	2. 요도천 오염하천 정화사업	"
하수시설과	3. 동량면 소재지 제방도로 보도설치 공사	향후추진
"	4. 세성초등학교 하수도 공사 노면보수공사	"
"	5. 주덕하수관거 설치공사	완 료
"	6. 안보리 오수관거 설치사업	"
하수처리과	7. 세성3리 벌말마을 하수도 공사	향후추진

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	물정책과	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 충주.교현천 오염하천 정화사업 <ul style="list-style-type: none"> 공사구간에 하천부지 경계를 명확히 하여 향후 민원이 발생하지 않도록 조치할 것 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <div> [사업개요] <ul style="list-style-type: none"> 규 모 : 9.5km(충주천6.5km, 교현천 3.0km) 사업기간 : 2002 ~ 2007(계속사업) 사 업 비 : 8,548백만원(양여금 6,192 물기금 1,650 지방비 706) 사업내용 : 생태공간 조성, 호안정비, 어도 및 보설치 등 추진공정 : 50% </div> <div> [처리결과] <ul style="list-style-type: none"> 공사 구간별로 사업 시행전 현황 측량을 실시하여 사유지는 이용시 소유자의 동의를 얻어, 기존의 콘크리트 호안을 철거하여 자연석형 식생호안으로 저수호안 조성을 완료 향후 고수부지내 산책로 조성, 수생식물 식재, 저수로내 자동수문 설치 공정으로 하천부지 경계와 관련한 민원은 없으나 주민불편이 없도록 최선을 다하여 시공 하겠음 </div> </div>							

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과


구분	시 정	회기	101회	처리부서	물정책과	처리결과	완료
<div> <input type="checkbox"/> 요도천 자연형하천 정화사업 <ul style="list-style-type: none"> 유수량에 비하여 징검다리가 낮게 시공되어 징검다리로서의 기능을 할 수 없으므로 징검다리의 간격을 넓히고 더 높여 시공할 것 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <div style="margin-top: 10px;"> <p>[사업개요]</p> <ul style="list-style-type: none"> 규 모 : 8.0km(주덕 계막교 ~ 이류 검단교) 사업기간 : 2003 ~ 2006(계속사업) 사 업 비 : 2,208백만원(양여금 1,586 물기금 436 지방비 186) 사업내용 : 자연형식생호안, 여울조성 등 추진공정 : 95% <p>[처리결과]</p> <ul style="list-style-type: none"> 징검다리 조정 완료(2005. 11. 4) <ul style="list-style-type: none"> - 높이 : 10cm상승(수면10cm ⇒ 수면20cm) - 간격 : 10cm확대(30cm ⇒ 40cm) </div> </div>							

사 진 대 지

공사명 : 요도천 자연형하천 정화사업



징검다리 보수 전, 중

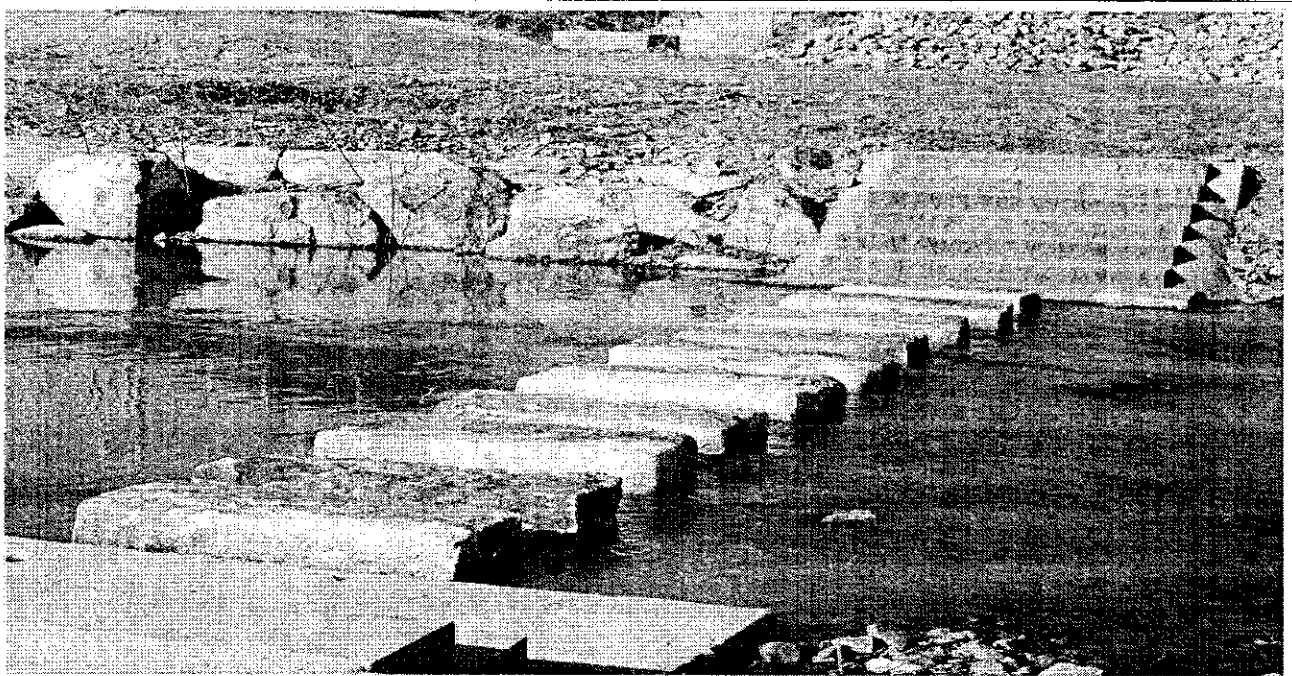

징검다리 보수 완료

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	하수시설과	처리결과	향후추진
<div> <div>□ 동량면 제방도로 보도설치공사</div> <div> <div>○ 동량면 주민들의 편의를 위하여 제방도로 보도를 설치하고 있는 바 현재 사업비로 주민들의 원하는 구간에 대한 공사를 완성할 수 없는 실정이므로</div> <div>○ 현재의 공사종점과 하수종말처리장 입구에 이르는 115m 구간과 가로등시설에 대한 예산을 내년도에 계상하여 사업이 지속적으로 추진될 수 있도록 조치하기 바람</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 조치계획</div> <div> <div>[사업개요]</div> <div> <div>○ 사업기간 : 2005. 8. 29 ~ 2005. 12. 31</div> <div>○ 위 치 : 충주시 동량면 조동리일원</div> <div>○ 사 업 량 : 280m (잔여구간 115m)</div> <div>○ 사 업 비 : 124,000천원</div> <div>○ 시 공 사 : 선진산업(주) 대표 박현철</div> </div> </div> </div>							
<div> <div>[조치계획]</div> <div> <div>○ 추가설치 대상</div> <div> <div>- 보도설치 : 115m</div> <div>- 가로등 설치 : 11개소</div> <div>- 소요사업비 : 50백만원</div> </div> <div>○ 예산확보 : 1회 추경예산 반영 조치</div> </div> </div>							

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	하수시설과	처리결과	향후추진
<div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 세성초등학교 하수도공사 노면보수공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 살미 세성3리 「세성초등학교 앞 ~ 예비군 훈련장」 구간 아스콘 포장도로는 하수관로 복구공사로 인한 노면의 마무리작업이 불량하여 굴곡이 심하고 교통사고 우려가 많은 실정으로 ○ 당구간 (500m)에 대하여 아스콘 덧씌우기 하자보수공사 조치하기 바람 </div>							
<div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <div style="margin-left: 20px;"> <p>[하수도정비공사]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업량 : 오수관 L=738m, 포장A=12a ○ 사업비 : 126,897천원 ○ 공사기간 : 2000. 11. 28 ~ 2001. 11. 22 ○ 시공사 : (주)한일개발 대표 방수혁 ○ 하자 보수기간 만료 <p>[조치계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소요사업비 추경 반영 조치 ○ 소요사업 : 50백만원 (사업량 B=7.0m, L=500m, A=35.0a) </div> </div>							

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	하수시설과	처리결과	완 료
<div> <input type="checkbox"/> 주덕 하수관거 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주덕읍 신양리 일대 인도에 설치된 다수의 우수받이 집수정 덮개가 노면보다 높게 시공되어 행인에게 불편을 줄뿐만 아니라 안전사고가 발생할 우려가 크므로 노면에 맞게 재시공할 것 </div>							
<div> <input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> ○ 집수정(우수받이) 전수조사 <ul style="list-style-type: none"> - 조사일시 : 2005. 10. 18 - 조사결과 : 보도700m구간 25개소 (집수정 불량 시공설치) ○ 조치결과 <ul style="list-style-type: none"> - 집수정 높이 조정 : 25개소 - 완료일시 : 2005. 11. 16 </div>							

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	하수시설과	처리결과	완 료
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 안보리 오수관거 설치사업</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민에게 불편을 주지만 마을환경 보존을 위해서도 꼭 필요한 사업임에도 불구하고 사업전에 주민에게 설명이 충분하지 않아 주민과의 적지 않은 마찰이 있음. 향후 사업추진시 해당지역 주민에게 충분한 사업 설명이 필요하고, 가가호호 차집관로 설치에 만전을 기하기 바람. </div>							
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>□ 처리결과 또는 조치계획</p> <p>[사업개요]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사 업 량 : 오수관 L=3,040m, 차집관 L=1,314m ○ 사 업 비 : 700백만원 ○ 공사기간 : 2005. 5. 4 ~ 12. 31 ○ 시 공 사 : 덕산건설 (주) 대표 박광규 <p>[조치결과]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안보리 북계마을 차집관로 설치시 직접 주민에게 사업 설명후 오수관거 설치 ○ 차집관로 설치 완료 - 일 시 : 2005. 12. 20 </div>							

2005행정사무조사 시정 및 개선요구사항 처리결과

구분	시 정	회기	101회	처리부서	하수처리과	처리결과	향후추진
<p><input type="checkbox"/> 세성3리 별말마을 하수도 공사</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 별말 마을 하수도는 세성3리 마을 가구의 1/3정도 밖에 차집이 되지 않음으로써 효율이 저하되는 문제가 있음. 차집을 안하는 세대에 대한 대책을 수립 시행하기 바람 							
<p><input type="checkbox"/> 처리결과 또는 조치계획</p> <p>[마을하수도 개요]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 오수처리시설 용량 : 60톤/1일 ○ 사용가구 : 28가구 ○ 추가요구 : 20가구 <p>[조치계획]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소요사업량 <ul style="list-style-type: none"> - 오 수 관 L=300m, 가정선 L=60m - 맨홀설치 10개소 ○ 사 업 비 : 100백만원 ○ 예산확보 : 1회 추경시 예산 확보 							
