

2010. 2 . . .

제144회 임시회

- 2009년도 행정사무조사 -

# 지적 및 개선요구사항 처리결과

경 제 건 설 국

## 2009년도 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

### 경제건설국

연번	시정 및 개선요구 사항 요목	소관부서	처리결과
1	소교량 가각설치	공통사항(도로과)	추진중
2	용탄농공단지 유희지 유상임대 검토	지역개발과	향후추진
3	주덕 화석 소하천 정비공사 마무리 철저	재난관리과	완료
4	요도천 도로포장공사 주변 보완	재난관리과	완료
5	터미널 ~ 황실장간 도로구간 도시계획반영	지역개발과	향후추진
6	이류 성종 ~ 부연간 도로확포장공사	도로과	완료
7	단월 모시래 도시계획도로개설공사 마무리 철저	도로과	완료
8	동부외곽순환도로 개설로 단절된 농로 확보 대책 강구	도로과	추진중
9	중앙중학교 방음벽 추가 설치	도로과	추진중
10	금가 도촌 도시계획도로 조속 마무리	도로과	추진중
11	마홀 ~ 상영간 도로개설 공사 마무리 철저	도로과	추진중
12	오랑 ~ 은대간 도로확포장 공사	도로과	완료
13	이류 완오 신촌마을 다목적광장 및 쉼터조성 공사 시설보완	건축디자인과	향후추진
14	임경업장군 묘소 진입로 및 주변정비사업	도로과	향후추진
15	송림마을 안길 덧씌우기 공사	교통과	향후추진

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 소교량 가각설치</div> <div>- 소교량 설치시 가각부분을 두지 않아 농기계 회전시 어려움을 겪고 있는 실정이므로 소교량 설치시에는 반드시 가각부분을 설치하여 농기계가 원활히 회전할 수 있도록 하기 바람</div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 소교량 설치시 가각부분 농기계 및 차량이 원활히 진출입 할 수 있도록 업무연찬 및 직원교육을 실시하여 설계시부터 반영하여 주민통행에 불편을 초래하지 않도록 조치</div> <div>○ 시설직(토목, 건축직)공무원 실무교육 실시 <div> <div>• 교육일시 : 2010. 2 ~ 3월중</div> <div>• 교육내용 : 2010년도 부실공사 방지대책 교육</div> <div>• 교육대상 : 시설직(토목, 건축직) 공무원</div> </div> </div> </div> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과




구분	검토	회 기	141회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후반영
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공단입주 업체의 야적장으로 활용하도록 용탄동 1137번지 유휴지를 정비한 바, 16,637평방미터에 이르는 큰 규모의 용지를 무상으로 제공할 경우 업체간 여러 가지 문제가 발생할 수 있으므로 유상임대를 적극 검토하기 바람.</li> </ul> </div>							
<div> <div>□ 처리결과</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용탄동 1137번지는 산업단지 기본계획상 폐수처리장 부지로, 향후 폐수처리장 건립 전까지 한시적으로 이용 가능</li> <li>○ '09년 설립되어 재정자립도가 미비한 충주산업단지관리공단의 자립사업 지원을 위하여 무상사용허가('09. 1. 28)</li> <li>○ 무상사용허가 기간은 3년이며, 향후 공단 자립이 예상되는 2012년 이후 유상임대 등 활용방안을 적극 검토하겠음</li> </ul> <div> <div>※ 현 부지내 관리공단 자립사업</div> <div> <div>▶ 잡자재 유통사업</div> <p>안전용품, 청소용품, 소모성 공구, 표준규격품, 기계부속류 등</p> </div> <div> <div>▶ 화물운반유통사업</div> <p>기업체 화물운송(제품, 원자재 등)</p> </div> </div> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	재난관리과	처리결과	완료
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 주덕 화석 소하천 정비공사 마무리 철저</div> <div> <p>호안조성 상단 농로둑은 유실 우려가 있으므로 잔디식재 등 보완 조치하기 바라며,</p> <p>공사 중간지점 낙차보에는 틈이 많이 있어 세굴될 우려가 있으니 틈을 보강할 것.</p> <p>호안조성은 설계대로 정확한 전석쌓기가 되도록 공극을 없애는 등 보완하고 공사 마무리에 철저를 기하기 바람</p> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>1. 사업개요</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사 업 명 : 화석소하천 정비공사</li> <li>• 사 업 량 : 호안(자연석)조성 L=846m, 낙차공 6개소</li> <li>• 사 업 비 : 410,726천원</li> <li>• 사업기간 : 09. 2. 27 ~ 8. 26</li> <li>• 공 정 율 : 100%</li> </ul> </div> </div> </div>							
<div> <div>2. 처리결과</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업명 : 화석소하천 사면 및 낙차공 보수</li> <li>• 사업량 <ul style="list-style-type: none"> <li>호안 상단 토사 사면 유실방지를 위하여 사면에 거적덮기 실시 ⇒ 거적덮기 L=765m(A=306m<sup>2</sup>)</li> <li>호안기초 쇄굴방지를 위하여 설치된 낙차보의 자연석 공극에 채우기 실시하여 유실 방지 ⇒ 2개소(A=48m<sup>2</sup>)</li> <li>호안(자연석쌓기) 시공 구간에 대하여 점검을 실시하여 공극 발생 부분에 대하여 식물이 자랄수있도록 채우기 실시 ⇒ L=765m</li> </ul> </li> </ul> </div> </div>							
<div>※ 붙 임 : 지적사항 처리결과 현장사진 1부. 끝.</div>							




## 지적사항 처리결과 현장사진

화석소하천 사면 보수

구 분	현 장 사 진
사업전	
공사중	
완료후	

## 지적사항 처리결과 현장사진

화석소하천 낙차공 보수, 전석 공극 채우기




구 분	현 장 사 진
사업전	
공사후	
전석공극 채우기	

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	재난관리과	처리결과	완료
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 요도천 도로포장공사 주변 보완</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 요도천 제방은 2.2km로 긴 거리에 비해 제방폭이 좁아 농기계등의 교행이 어려운바, 적정장소에 교행공간을 확보하기 바라며,</li> <li>- 성동 앞 배수문옆 농로연결부는 경사가 급하여 농기계 진출입이 어려움으로 높낮이를 완만하게 하고 진입 날개부분을 기존보다 넓게 포장할 것</li> </ul> </div> </div> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>1. 사업개요</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사 업 명 : 주덕 요도천 도로포장공사</li> <li>• 사 업 량 : 콘크리트포장 L=2,290m, B=3.0~3.5m</li> <li>• 사 업 비 : 198,000천원</li> <li>• 사업기간 : 09. 3. 9 ~ 6. 25</li> <li>• 공 정 율 : 100%</li> </ul> </div> <div>2. 처리결과</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 사업명 : 요도천 제방도로 보수공사</li> <li>• 사업량 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제방도로 포장폭은 3.5m로서 포장시 차량 교행이 가능토록 접속 농로를 이용하여 5개소(A=70m<sup>2</sup>) 설치하였고, 현장 확인 후 가능부분에 추가로 2개소(A=28m<sup>2</sup>)를 설치하여 교행이 가능토록 하였음.</li> <li>- 성동 배수문 앞 농로 연결도로의 경사가 심한 부분은 완만한 경사가 되도록 보완하고, 안전사고 예방을 위하여 안전 방지턱 설치 및 진.출입 부분은 넓게 포장 하였음 ⇒ 1개소(L=23m, B=5.0m)</li> </ul> </li> </ul> </div> </div> </div>							
※ 불 입 : 지적사항 처리결과 현장사진 1부. 끝.							




## 지적사항 처리결과 현장사진

요도천 제방도로 교행공간 설치

구 분	현 장 사 진
사업전	
공사중	
완료후	

## 지적사항 처리결과 현장사진

요도천 농로연결도로 경사지 보완

구 분	현 장 사 진
사업전	
공사중	
완료후	

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	지역개발과	처리결과	향후추진
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 터미널 ~ 황실장간 도로구간 도시계획변경 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 터미널~황실장간 도로구간을 하이마트 뒤 신규예정아파트 앞 도로와 로폭이 동일하게(15m) 하고 교량이 설치될 수 있도록 도시계획에 반영 조치하기 바람</li> </ul> </li> </ul> </div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도로현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설명 : 도로(중로3-1)</li> <li>• 규 모 : L=831m, B=12m</li> <li>• 최초결정일 : 건설부 고시 제1976-39('76.3.27)</li> </ul> </li> <li>○ 향후 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 도시관리계획 재정비 추진 중으로, 재정비(안) 내용에 포함하여 종합적으로 검토하여 추진</li> </ul> </li> </ul> </div>							


## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	완료
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 이류 성종~부연간 도로확포장공사</div> <div> <div>- 새로 개설하려고 하는 구간은 지역주민의 반대가 심하고 도로의 활용도가 높지 않으므로 현재 도로개설이 진행중인 부연마을 회관까지만 2차선 도로로 확포장하고 종점부까지는 기존 도로로 활용하고 있는 부분에 대하여만 보상하고 덧씌우기 작업을 하기 바람</div> </div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 부연마을로 들어가는 진입부분 보상에 대해서는 경매(1필지 160㎡)중이며 보상완료 후 기존도로에 대한 선형개량 및 유지보수차원에서 공사추진하여 마을회관까지만 확포장할 계획임</div> </div> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	완료
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 단월 모시래 도시계획도로개설공사 마무리 철저</div> <div> <div>- 공사구간은 주택과 접해있는 도로로 경사가 급하여 안전사고의 우려가 있으므로 적정장소에 안전도색을 하여 차량이 서행하도록 조치할 것</div> </div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 공사구간 주택과 접해 있는 도로에 대하여 교통사고 발생우려가 있는 차로 교차지점(도로상) 장소에 안전사고 방지를 위한 과속방지턱(이미지) 1개소설치 완료조치</div> </div> </div>							

## □ 현황사진

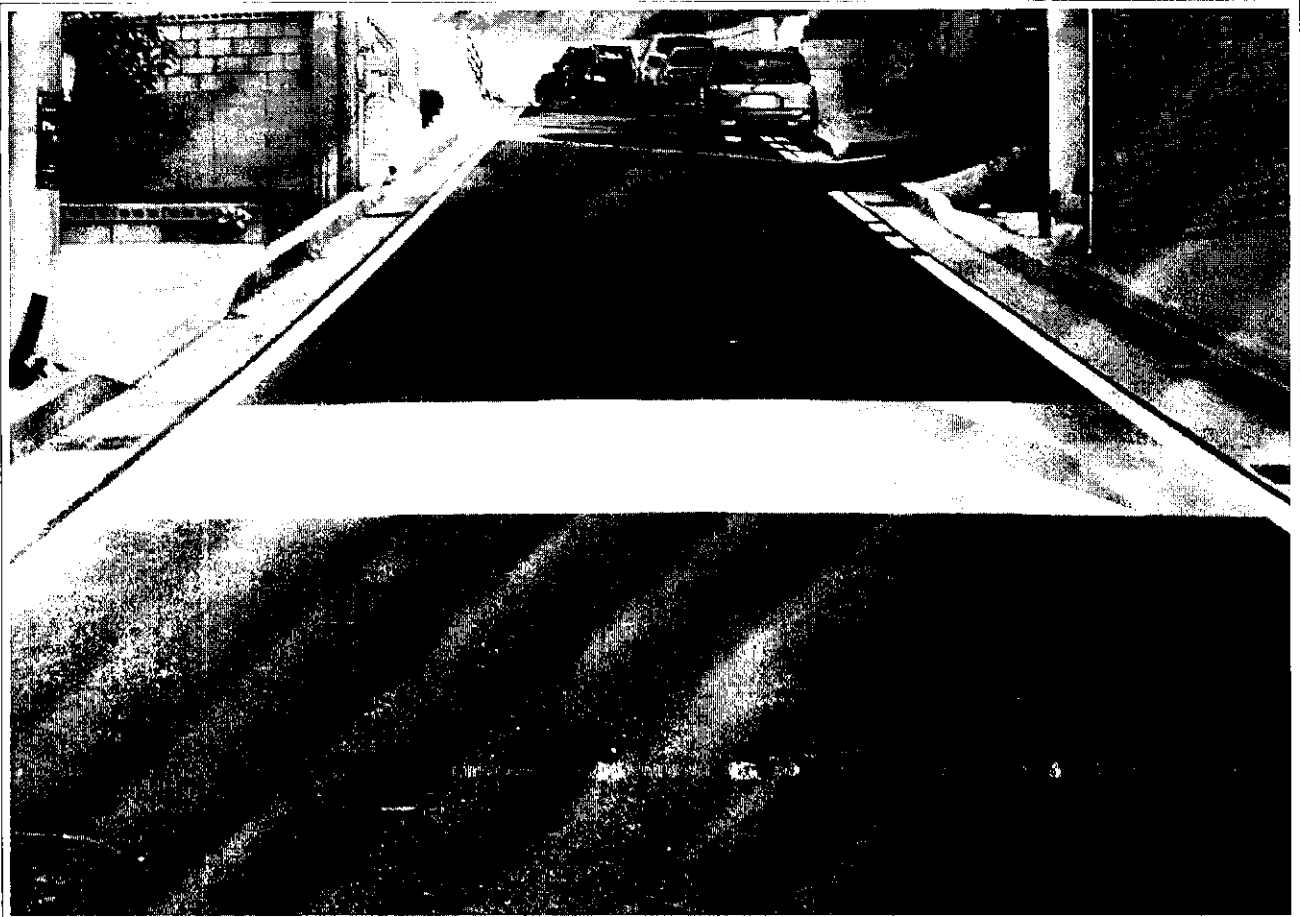

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 동부외곽순환도로 개설로 단절된 농로 확보대책 강구</div> <div> <div>- 아이파크@ ~ 금곡마을간 동부외곽순환도로 개설로 농로가 단절 됨으로써 농경지 및 인근 주택 출입 시 교통사고 발생이 우려되므로 농경지 및 주택을 안전하게 출입할 수 있도록 대책을 강구하기 바람</div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ '09. 12월 : 추진공정 70%</div> <div>○ 농로가 필요한 구간 : 2개소(주공7단지~금곡마을간)</div> <div>○ 이후 추진계획</div> <div> <div>• 기존 농로의 진출입이 용이하도록 연결할 계획이며</div> <div>• 대로의 원활한 차량 소통 등의 감안과 농기계 및 차량이 횡단을 할 수 있도록 주공7단지~금곡마을구간에 정지신호등 2개소 설치 및 회전(U턴)차로를 추가 반영할 계획임</div> </div> </div> </div> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 중앙중학교 방음벽 추가 설치</div> <div>- 도로 전면에는 방음벽 설치가 완료되어 소음이 현격히 줄어들었으나 측면(교현주공A) 미설치로 효용성이 반감되므로 정문쪽에 30m 정도를 추가 설치하여 사업효과를 높여 주시기 바랍니다</div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 2009. 10월 : 방음벽 설치 의견 요청 / 시 → 중앙중학교</div> <div>○ 2009. 12월 : 방음벽 설치 의견 회신 / 중앙중학교 → 시</div> <div>⇒ 회신내용 : 중앙중학교 측면(교현주공@)이 아닌 후문방향에 방음벽 추가 설치 요구</div> <div>○ 중앙중학교 협의결과에 따른 후문방향에 방음벽 추가 설치</div> <div>○ 2010년 추경에 예산확보 추진</div> <div> <div>• 사업량 : 방음벽 설치 (L=30m)</div> <div>• 사업비 : 70,000천원</div> </div> </div> </div>							


## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 금가 도촌 도시계획도로 조속 마무리</div> <div> <div>- 금가 도촌 도시계획도로 900m 잔여구간의 사업을 내년도 전구간이 개통될 수 있도록 추진하여 주민불편이 없도록 조치하고,</div> <div>- 준공구간 상수도맨홀 주변 마무리(점토블럭과의 마감부분)가 불량하니 마감 부분을 재시공 할 것</div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 금가도촌도시계획도로</div> <div> <div>- 공사구간                             <div>• 구국도 ~ 농어촌도로(102호선) 연결되는 도로</div> </div> <div>- 추진상황                             <div>• 2009년도 L=100m 공사 완료 / 구국도~파밀리온@</div> </div> <div>- 추진계획                             <div>• 2010년도 사업비 300백만원 확보(L=300m) / 파밀리온@ ~ 금가초교 진입로</div> <div>※ 2010년 이후 L=640m 공사 추진</div> </div> <div>○ 2010년도 금가초교입구(300m)까지 공사추진하겠음</div> <div>○ 기존 파손된 점토블럭을 모두 제거 후, 맨홀 모양에 맞춰 정확히 재단후 보완(재설치) 완료</div> </div> </div> </div></div>							

## 행정사무감사 조치결과 사진대장



조치전 : 맨홀뚜껑 주위의 점토블럭이 불규칙하게 파손되어 있음

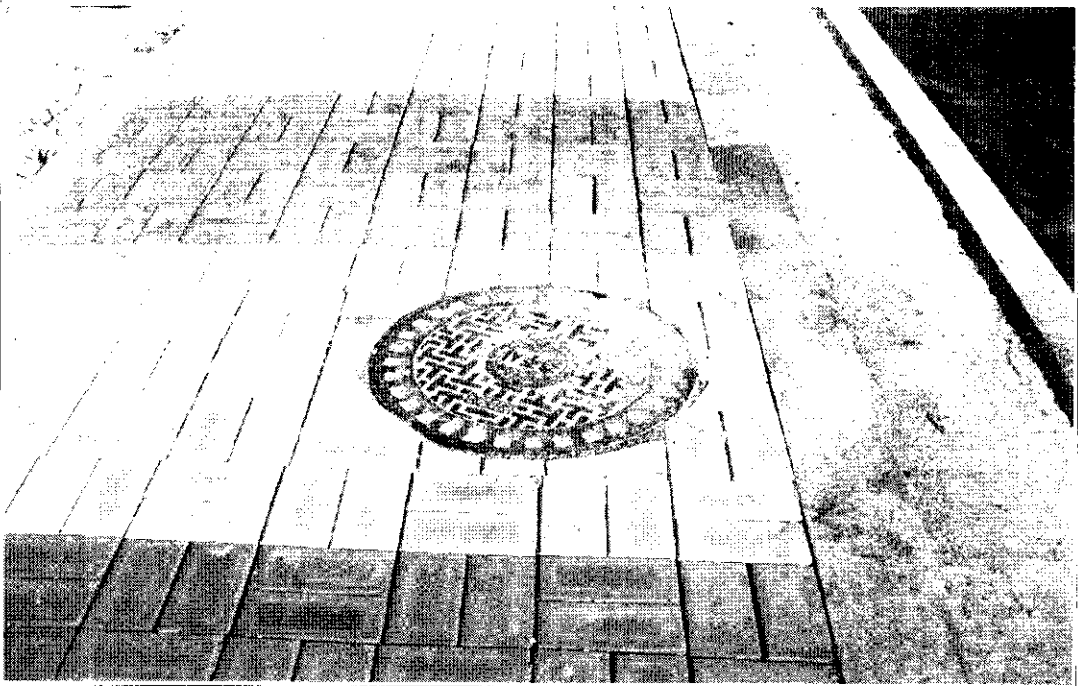

조치후 : 기존블럭 제거 후 맨홀뚜껑 주위에 점토블럭 재시공완료

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 마홀~상영간 도로개설 공사 마무리 철저</div> <div> <div>· 09년 6월 준공된 마홀~상영간 도로개설 공사 마무리가 미흡하니 다음 사항을 조치하여 마무리에 철저를 기하기 바람</div> <div> <div>- 노면 빗물 처리 미흡(경계석 및 집수정 설치)</div> <div>- 암벽 사면 재시공(녹생토 등으로 재시공)</div> <div>- 비탈면 레미콘 시공 균열 부분 재시공</div> <div>- 거적덮기 처리 사면 마무리 철저</div> </div> </div> </div> <div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 거적덮기 사면처리 및 옹벽 균열 보수 부분은 시공자로 하여금 동절기 공사중지가 해제되면 즉시 개선토록 하고</div> <div>○ 노면 빗물처리를 위한 경계석 및 집수정과 사면보호를 위한 비탈면 보호공은 연계사업인 2010년 용암(마홀~상영)군도 정비공사에 포함 시공하겠음</div> </div> </div> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	시정	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	완료
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div>○ 오랑~은대간 도로확포장 공사</div> <div>- 공사로 인해 주민 거주민이 불편을 겪지 않도록 공사장에 물을 자주 뿌려 비산먼지 발생을 예방하도록 할 것</div> <div>- 은대교 법면 부분이 강우시 토사 유실 및 붕괴 우려가 있으니 기존 옹벽과 연결하여 시공하기 바람</div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div>○ 자연석 쌓기(L=50m)로 호안을 정비하여 토사유실 및 붕괴가 되지 않도록 조치 완료하였음</div>							

## 행정사무감사 조치결과 사진대장



조치전 : 자연석 쌓기전



조치후 : 자연석쌓기 시공 완료

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	지적	회 기	141회	처리부서	건축디자인과	처리결과	향후추진
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>이류완오신촌마을 다목적광장 조성사업이 전체적으로 사업은 잘 되어 있으나, 향후 시설을 이용하면서 게이트볼 경기중 실내화장실을 이용함으로써 불편이 발생되면 실외에도 간이 화장실을 설치하는 방안을 강구하기 바람</li> </ul> </div>							
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>이용실태                             <ul style="list-style-type: none"> <li>20여명 회원이 월 15일 이용(동절기 제외)</li> </ul> </li> <li>향후조치계획                             <ul style="list-style-type: none"> <li>게이트볼장 이용빈도 및 이용자 증가, 주변환경등을 고려하여 화장실 설치 필요성에 대하여 검토 하겠음</li> </ul> </li> </ul> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	도로과	처리결과	향후추진
<div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임경업장군 묘소 진입로 및 주변정비사업 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 풍동 상풍마을 임경업장군 묘소 진입로는 풍동~용두간 국도대체우회 도로에서 진입할 수는 있으나 수안보 방향으로 진출로가 없어 임경업장군 묘소 방문객 및 지역주민의 불편을 초래하고 있는 바, 상풍마을에서 수안보방향으로 진출로를 국도대체도로와 연결할 수 있는 방안을 강구하기 바람</li> </ul> </li> </ul> </div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사당시 진입로 검토 되었으나 여건상 시공되지 않았으며</li> <li>○ 상풍마을 진입로에서 국도대체우회도로 수안보 방향 1km지점에 교차로가 있고, 가속차로의 설치가 지난함</li> <li>○ 기존도로 확포장 하여 수안보방향 진입을 용이하게 하는 방향으로 검토(약 1km정도)</li> </ul> </div>							

## 2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	개선	회 기	141회	처리부서	교통과	처리결과	불가
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송림마을 안길은 도로폭이 좁아(3.5m내외) 차량교행은 물론 차량과 보행자와의 교행에도 어려움이 있는바, 버스노선을 변경하여 하천제방을 이용을 강구하기 바람</li> </ul> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하천정비사업 현황 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공사기간 : 2004. 11. 15~2010. 12. 30</li> <li>• 사 업 량 : 5,979m (현재까지 4,794m 시공) <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 송림마을 (1,185m) : 2010년 완공</li> </ul> </li> <li>• 시 행 청 : 대전지방국토관리청(시공회사 건도, 재덕건설)</li> </ul> </li> <li>○ 조치계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 현재 공사중인 제방설계 내용을 확인하여 대전청과 운행 가능성 협의하여 추진하고</li> <li>• 향후 연결도로, 회차공간 확보시 노선변경 추진계획</li> </ul> </li> </ul> </div>							
