

1995. 8.

議會業務報告

95主要業務推進狀況

山 林 課

報 告 順 序

I. 一 般 現 況

1. 기구 및 정·현원
2. 기본현황

II. 主 要 業 務 推 進 狀 況

1. 조림사업
2. 육림사업
3. 산림 병해충 방제
4. 산불방지
5. 임도시설
6. 사유림 두릅나무 시범지조성


I . 一 般 現 況

1. 기구 및 정·현원

2. 기본현황

1. 機構 및 定現員

○ 機 構

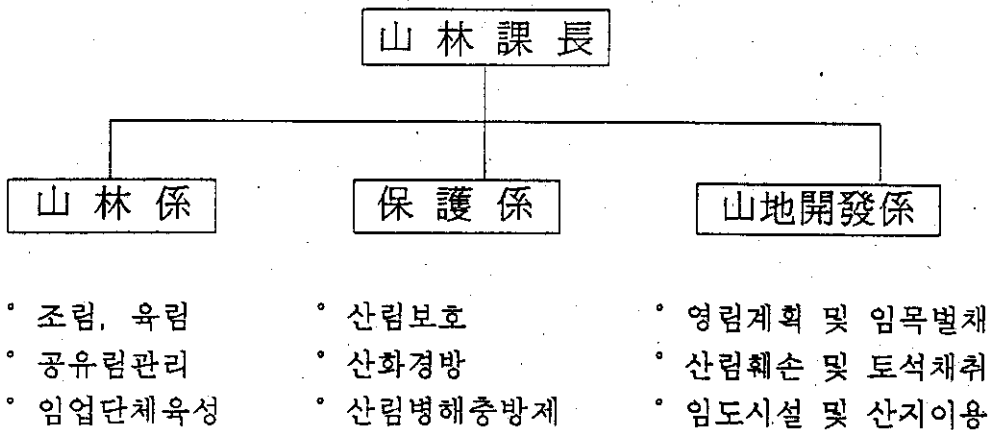

○ 定, 現員

직급 구분	계	5급	6급	7급	8급	9급	청원직	일 용
정 원	20	1	3	4	2	4	5	1
현 원	20	1	3	4	2	4	5	1

2. 基本現況

○ 所有別 林野面積 및 蓄積

소 유 별		면 적	비 율	축 적	비 고
합 계		63,871ha	100%	2,711천m'	ha당 축적 42.5m' 국 : 43.95m' 공 : 42.04m' 사 : 42.34m'
국 유 림		6,735	11	296	
공 유 림	소 계	13,845	21	582	
	도유림	2,764	4	120	
	시유림	11,081	17	462	
사 유 림		43,291	68	1,833	

○ 用途別 林野面積

합 계 : 63,871ha

보 전 임 지 : 45,672ha

준보전임지 : 18,244ha

○ 保安林 指定 現況

(단위 : ha)

구 분	합 계		상모면		신니면		노은면		양성면		엄정면	
	필수	면적	필수	면적	필수	면적	필수	면적	필수	면적	필수	면적
계	371	1,368	57	390	98	275	27	85	84	330	105	288
공유림	27	313	8	254	7	10	3	13	8	35	1	1
사유림	344	1,055	49	136	91	265	24	72	76	295	104	287

※ 보안림종류 : 제 1 종 수원함양 보안림('88. 2 지정)

○ 保護樹 指定現況

합 계	道나무	市나무	面洞나무	마을나무	비 고
67본	3본	28본	33본	3본	

※ 수종 : 느티나무(46), 은행나무(3), 소나무(5), 상수리나무(2)
향나무(1), 시무나무(2), 말채나무(2), 측백나무(1), 버드나무(1), 회화나무(2), 팽나무(2).

○ 산불鎮火 裝備

품 명	동력펌프	기계톱	무전기	감시초소	방화복	기 타
수 량	10대	12대	99대	17개소	61착	1,500점 (갈퀴)

○ 山林病害蟲 防除裝備

품 명	동력분무기	약제주입기	동력천공기	비 고
수 량	3대	257대	57대	

※ 방제차량(4.5H/T) : 1대

Ⅱ. 主要業務推進狀況

1. 조림사업
2. 육림사업
3. 산림병해충 방제
4. 산불방지
5. 임도시설
6. 시유림두릅나무 시범지 조성

1. 造林事業

○ 사업기간 : '95. 3. 10 ~ 4. 20.

○ 사업량 : 347ha

○ 사업비 : 498,373천원(국:48%, 도:14%, 시:38%)

□ 지금까지 추진상황 : 사업완료

합	계 : 347ha	876.6천본
- 장기수 조림 :	259 "	781.0 "
- 유실수 조림 :	23 "	9.2 "
- 대 묘 조 립 :	7 "	10.5 "
- 환 경 조 립 :	33 "	38.4 "
- 맹 아 갱 신 :	25 "	37.5 "

2. 育林事業

□ 어린나무 가꾸기 事業

○ 목 적 : 인공조림목 생장에 지장을 주는 덩굴류 및 잡관목을 제거하여 양질의 목재생산 유도

○ 사업량 : 630ha

○ 사업기간 : 95. 4. 20 ~ 11. 30

○ 사업비 : 244,437천원 (국:50%, 도:15%, 시:35%)

○ 지금까지 추진상황 : 50ha(8%)완료

○ 금후추진계획 : 사업추진(11. 30일 완료)

□ 덩굴류 除去事業

○ 사업량 : 257ha

○ 사업비 : 43,096천원 (국:69%, 도:9%, 시:22%)

○ 추진실적 : 사업완료

☐ 天然林 保育事業

- 목 적 : 우량림으로 구성된 활엽수임지에 불량목, 방해목 등을 제거하여 우량목재 생산을 유도
- 사 업 량 : 140ha
- 사업기간 : 95. 4. 20 ~ 11. 30
- 사 업 비 : 73,482천원 (국:50%, 도:15%, 시:35%)
- 지금까지 추진실적 : 대상지 조사 확정
- 금후 추진계획 : 사업추진 (11. 30일 완료)

☐ 造林地 풀베기 事業

- 목 적 : 조림목의 햇빛공급 및 건조를 방지하여 임목성장 도모
- 대 상 : 조림후 4년이내의 인공조림지
- 사 업 량 : 1,360ha
- 사업기간 : 95. 6. 20 ~ 8. 30
- 사 업 비 : 196,510천원 (국:50%, 도:15%, 시:35%)
- 지금까지 추진실적
 - ° 읍, 면, 동 사업비 배부 : 19개 읍, 면, 동
 - ° 사업추진 : 605ha(55%)
- 금후 추진계획 : 95. 8. 30사업완료

☐ 撫育間伐 事業

- 목 적 : 장기수 인공조림지의 고사목 또는 피압목등을 제거하여 임분의 생육공간 조절
- 사 업 량 : 396ha
- 사업기간 : 95. 4. 20 ~ 11. 30
- 사 업 비 : 176,210천원 (국:50%, 도:15%, 시:35%)
- 지금까지 추진실적 : 대상지 확정
- 금후 추진계획 : 사업추진 (95. 11. 30일 완료)

3. 山林病害蟲 防除

가. 솔잎혹파리 防除

○ 사업기간 : '95. 3. 20 ~ 11. 30.

○ 사업량 : 1,712ha

○ 사업비 : 578,034천원 (국:37%, 도:19%, 시:44%)

☐ 수간주사

○ 사업량 : 1,072ha

○ 사업기간 : '95. 5. 25 ~ 7. 20

○ 사업비 : 461,034천원 (국:37%, 도:19%, 시:44%)

○ 추진실적 : 사업완료

☐ 피해목 벌채

○ 사업량 : 120ha

○ 사업기간 : '95. 6. 20 ~ 11. 30.

○ 사업비 : 51,811천원 (국:37%, 도:19%, 시:44%)

○ 추진실적 : 사업착수('95. 11. 30. 완료)

☐ 항공엽면시비

○ 사업량 : 400ha

○ 방제기간 : '95. 6. 6 ~ 6. 7.

○ 사업비 : 10,176천원 (국:27%, 도:20%, 시:53%)

○ 추진실적 : 사업완료

☐ 비료주기

○ 사업량 : 120ha

○ 방제기간 : '95. 3. 25 ~ 4. 15.

○ 사업비 : 5,013천원 (국:47%, 도:16%, 시:37%)

○ 추진실적 : 사업완료

나. 一般害蟲 防除

- 사업량 : 480ha
- 사업기간 : '95. 5. . . ~ 9. 30
- 사업비 : 41,735천원(도:30%,시:70%)
- 지금까지 추진실적

해충명	발생면적	방제면적	비고
원불나방 외 2종	ha 127	ha 127	% 100

- 금후 추진계획 : 지속적인 예찰로 즉시 약제살포 방제

4. 산불防止

산림애호의식 확산으로 산불방지의 공감대를 조성하고
초동진화체제의 확립으로 산림피해 최소화

- 추진기간
 - 봄철 : '95. 3. 1 ~ 5. 31. (3개월)
 - 가을철 : '95. 11. 15 ~ 12. 15. (1개월)
- 사업비 : 271,714천원(국: 1%, 도:24%, 시:75%)

☐ 지금까지 추진실적(봄철)

- 산불 대책 본부 운영 : 산림과 외 20개 읍,면,동
- 산불 유급감시원배치 : 62명
- 산불예방 홍보물설치 : 산불조심깃발 외 10종
- 산불진화대 조직정비
- 입산 통제 구역 지정 : 10,035ha

☐ 금후 추진계획

- 가을철 산불조심기간대비 예방체제 점검

5. 林道施設

- 위치 : 충주시 동량면 서운리 외 3개소
- 사업기간 : 95. 3. 1 ~ 11. 23
- 사업량 : 8.2km
- 사업비 : 501,680천원 (국:61%, 도:31%, 시:8%)

☐ 林道新設

- 위치 : 충주시 동량면 서운리외 2개소
- 사업기간 : 95. 5. 4 ~ 11. 23
- 사업량 : 8km
- 사업비 : 392,000천원 (국:50%, 도:40%, 시:10%)
- 지금까지 추진실적
 - 별근제거 완료
 - 토공작업 : 3.0km
- 금후추진계획
 - 토공작업
 - 구조물 설치작업

☐ 남산 林道水害復舊 (`94년도 이월사업)

- 위치 : 충주시 목벌동 산58-3
- 사업기간 : 95. 3. 1 ~ 9. 30
- 사업량 : 0.2km
- 사업비 : 109,680천원(국비)
- 지금까지 추진실적 : 구조물 설치 5개소
- 금후추진계획
 - 옹벽 2개소 (59m)
 - 횡단배수관 5개소(60m)

6. 市有林 두릅나무 示範地造成

- 목 적 : 시유림의 효율적이용 및 사유산주들의
투자의욕 고취
- 위 치 : 충주시 가금면 창동 산18-26(시유림)
- 사업기간 : 95. 3. 10 ~ 8. 30
- 사 업 량 : 2ha
- 사 업 비 : 9,035천원
- 지금까지 추진실적 : 묘목식재 (10,000본)
- 금후추진계획 : 풀베기 작업
