

2010. 2 . .
제144회 임시회

- 2009년도 행정사무조사 -

지적 및 개선요구사항 처리결과

문 화 복 지 국

2009년도 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

문화복지국

연번	지적 및 개선요구사항 요목	소관부서	처리결과
계	4건 (완료 1, 추진중 3)		
1	수안보 생활체육공원 조성사업	문화체육과	추진중
2	지현동 게이트볼장 마무리 철거	"	완 료
3	관아골 문화의거리 조성사업 조속 추진	"	추진중
4	야외공연무대 설치시 활용빈도 등 고려	"	"

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과



구분	회 기	141회	처리부서	문화체육과	처리결과	추진중
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 수안보 생활체육공원 조성사업</p> <ul style="list-style-type: none"> 수안보 생활체육공원 조성사업 부족 예산은 조속히 확보하여 계획대로 사업을 마무리 하기 바람 <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> 위 치 : 충주시 수안보면 안보리 419-1번지 일원 사 업 비 : 7,200백만원(국비 1,900, 도비 740, 시비 4,560) 사업규모 : 부지면적 61,222㎡, 건축연면적 273.5㎡ 축구장 2면, 게이트볼장, 족구장, 테니스장, 배드민턴장, 산책로, 관리동, 주차장 등 사업기간 : 2006 ~ 2010. 12 <p>○ 현재까지 추진사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 사업비 : 전체 7,200백만원 <ul style="list-style-type: none"> 기투자 : 6,550백만원, 2010년 : 220백만원, 향후(추경) : 430백만원 사업량 <ul style="list-style-type: none"> 부지조성, 축구장 2면, 게이트볼장 1면 : 2010. 2월 준공 예정 <p>○ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> 제1회 추경예산에 부족사업비 430백만원 반영 추진 2010. 10월 전체사업 준공 예정 						

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	문화체육과	처리결과	완 료
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 지현동 게이트볼장 마무리 철거</p> <ul style="list-style-type: none"> 지현동 게이트볼장 마무리 공사가 전반적으로 미흡한 바 다음 사항의 조치를 통하여 사업 마무리에 철저를 기할 것 <ul style="list-style-type: none"> - 전기 인입공사를 통해 전기사용이 가능하도록 조치 - 경기장 보호망 설치(관람자 보호) - 겨울철 미끄럼 방지시설 설치(경기장 테두리 및 게이트볼장 입구) - 옹벽 윗 부분 및 관리동 앞 공사 마무리 - 방치된 공사자재 철거(석축용 블록) - 웬스 높이가 전반적으로 낮으며, 이로 인해 무단출입한 아이들의 추락 위험이 있음 - 비가람막 설치로 전천후 운동이 가능할 수 있도록 조치 <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 조치계획</p> <ul style="list-style-type: none"> '09. 11월초 지현동사무소에서 사업비 14백만원을 투자하여 전기 및 상수도 인입, 화장실설치, 옹벽 및 관리동 앞 주변정비, 미끄럼 방지시설 보완, 방치자재 정비 등을 완료조치 하였음. 게이트볼장 웬스 높이는 1.2m로 적정하므로 반상회 등을 통해 어린이들의 게이트볼장 무단출입 통제를 당부하겠으며, 비가람 등 전천후시설 설치는 호암체육관 주변에 2011년 준공 예정으로 추진중인 전천후 게이트볼장(6면)을 이용하도록 적극 홍보하겠음. 						

사 진 대 지

□ 화장실 설치 (전·후)

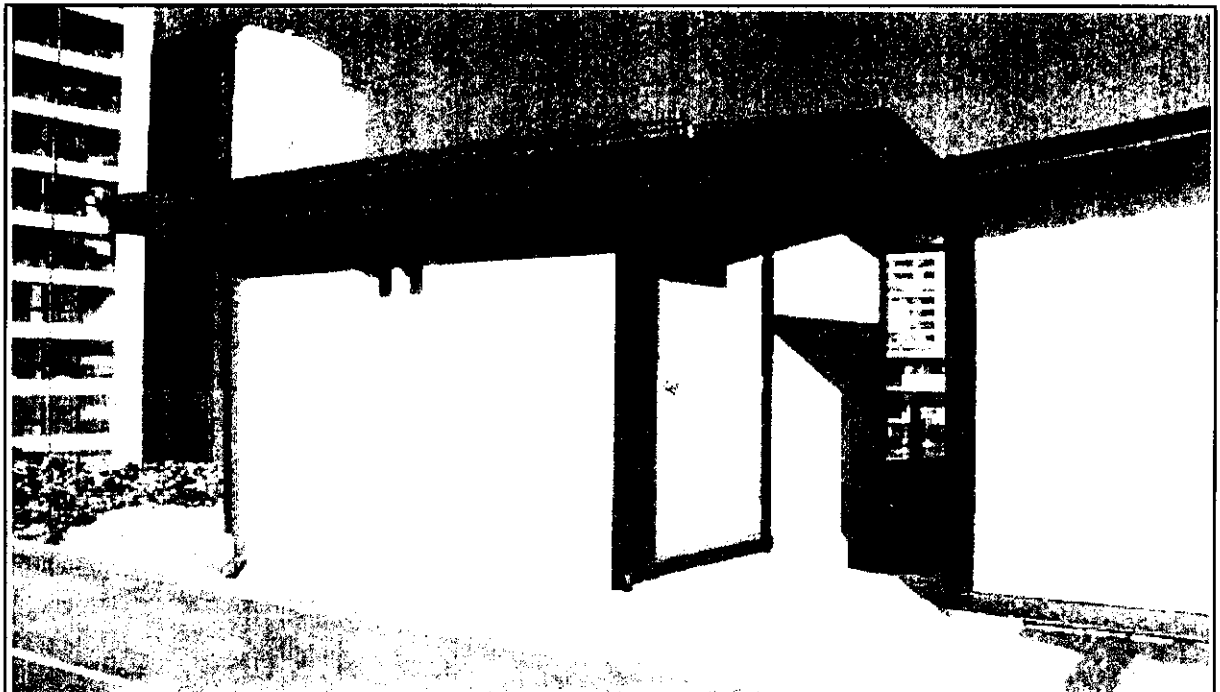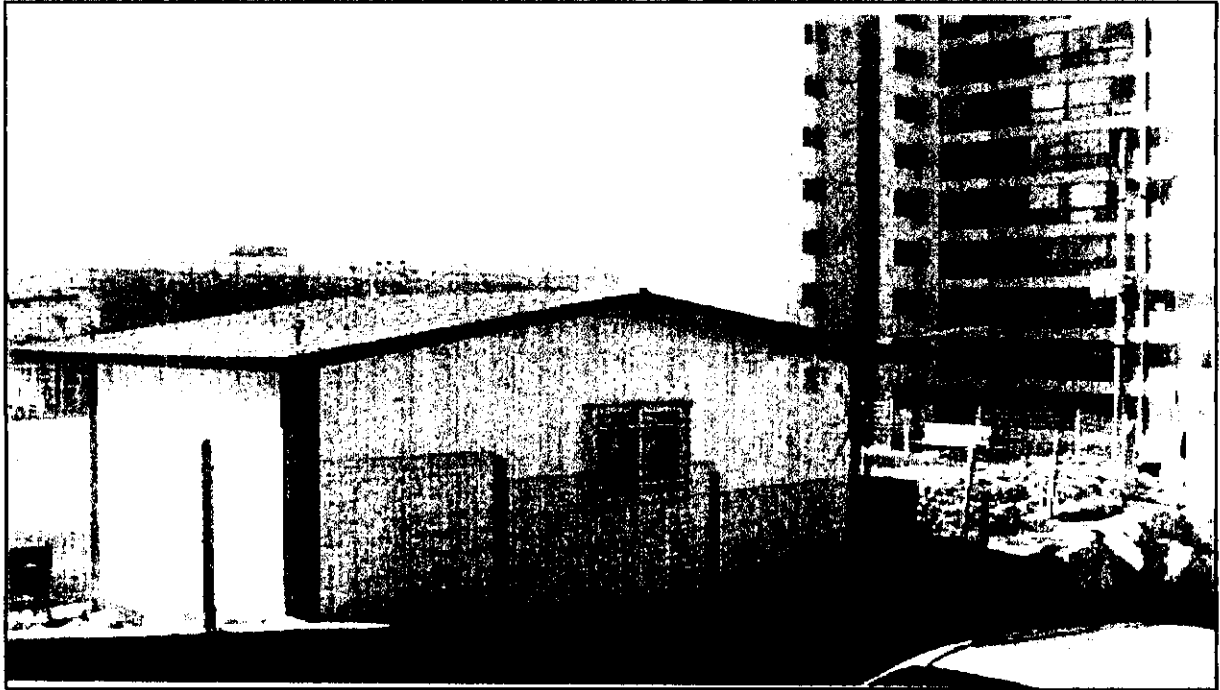

사 진 대 지

□ 배수로 정비(전·후)



2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	문화체육과	처리결과	추진중
<div> <div>□ 지적 및 개선요구사항</div> <div> <div>○ 관아골 문화의거리 조성사업 조속 추진</div> <div>· 관아골 주차장내 야외무대 설치사업 추진이 미진하니 해당 주민의견을 충분히 반영하여 조속히 추진하기 바람</div> </div> </div>						
<div> <div>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</div> <div> <div>○ 지금까지 추진사항</div> <div> <div>- 2007. 10월 일반사업계획 수립</div> <div>- 2008. 5월 문화의거리추진위원회 개최 (구간설정 등)</div> <div>- 2008.7~12월 사업신청 및 심사 (충북도)</div> <div>- '08.9 ~ '09.2 기본계획 수립용역 완료 (충주대 산학협력단)</div> <div>- 2009. 3월 사업비 확보(400백만원) ---- “2009. 1회추경”</div> <div>- 2009. 6. 10 문화의거리조성심의위원회 개최(위원위촉, 사업계획 확정)</div> <div>- 2009. 6. 22 관아골 문화의거리조성 설계용역 계약(한알건축)</div> <div>- 2009. 8. 18 설계용역 추진상황 현장설명회 개최</div> <div>- 2009. 8. 21 설계용역 중지</div> <div>- 2009. 11.20 문화의거리조성심의위원회 개최 (주민의견 반영 등 계획변경)</div> <div>- 2009. 11.24 설계용역 해제</div> <div>- 2009. 12. 1 실시설계용역 결과물 납품</div> </div> </div> </div>						
<div> <div>○ 향후 조치계획</div> <div>- 2010. 3월 공사계약 및 착공</div> </div>						

2009 행정사무조사 지적 및 개선요구사항 처리결과

구분	회 기	141회	처리부서	문화체육과	처리결과	추진중
<p>□ 지적 및 개선요구사항</p> <p>○ 야외공연무대 설치시 활용빈도 등 고려</p> <p>· 2005년 15,000천원의 예산으로 충주예총회관 건물과 연접하여 설치한 야외공연무대는 2009년 10월 현재 우륵문화제 행사까지 포함하여 총 5차례 사용되었을 정도로 활용도가 낮으며, 무대 또한 건물과의 부조화로 건물 경관을 해치고 있으니 적절한 타 장소로 이전 등의 방법을 강구하기 바람</p> <p>□ 처리결과 또는 향후 조치계획</p> <p>○ 예총사무실 앞 간이무대는 무대높이가 높고, 무대 상판이 방부목으로 구성되어 공연장으로 비 선호</p> <p>따라서, 「관아골 문화의거리 조성사업」 일환으로 무대 높이를 낮추는 등 보수하여 사용코자 하였으나,</p> <p>지역예술인과 문화의 거리조성 심의위원회의 결정에 따라 기존 무대를 철거하고 현재 유희공간으로 있는 남측 공간에 제대로 된 무대조성을 추진 중</p> <p>- 규 모 : 4m × 8m</p> <p>- 형 태 : 막구조, 강화유리 바닥, 기본조명</p> <p>- 사 업 비 : 48,000천원</p>						
